

A stylized graphic of a circuit board with white lines and circles on a blue gradient background.

DISEÑO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS II

CONTROL EN EL PROYECTO.

REUNIONES DE AVANCE.


VALOR GANADO.

Escuela Superior Técnica

CONTROL EN EL PROYECTO

- Es el proceso mediante el cual se mantiene al proyecto encaminado hacia su objetivo y tan cercano como sea posible a lo planificado.
- Debe existir un PLAN:
 - El Plan anticipa acciones, el Control las inicia
 - El Plan fija objetivos, el Control guía hacia ellos.
 - El Plan asigna recursos, el Control asegura su utilización eficiente.
 - El Plan anticipa problemas, el Control los corrige.

CONTROL EN EL PROYECTO

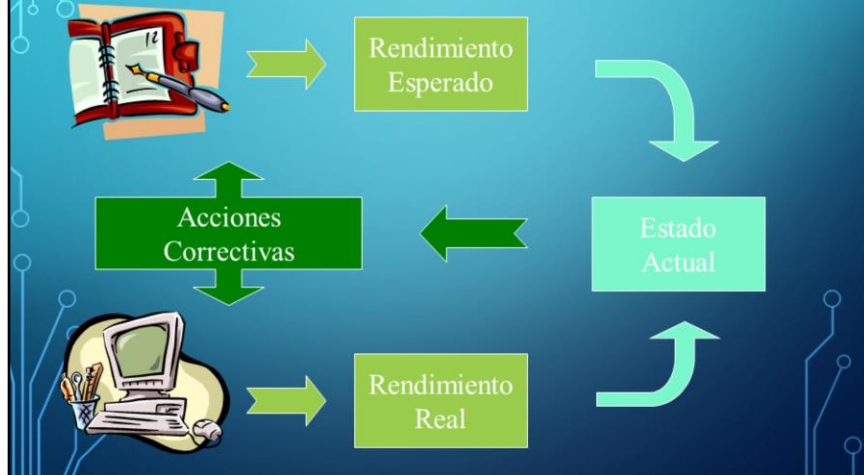

INFORMACIÓN PARA EL CONTROL

Calendario

Costo

Calidad

Recolección

Organización

Informe

- Balancear entre el costo de obtener la información y el valor de la misma.

REUNIÓN DE AVANCE

- Reunión periódica para informar a los interesados en el proyecto el estado del mismo.
- Reunión periódica del Equipo de Trabajo para definir el estado del proyecto y los próximos pasos.

REUNIÓN DE AVANCE

- Debe ser PERIÓDICA:
- No suspenderla cuando vamos bien → Es la oportunidad de intercambiar expectativas.
- No suspenderla cuando vamos mal → Es cuando más la necesitamos.

REUNIÓN DE AVANCE

- Información a incluir:
 - Calendario
 - Esfuerzo
 - Avance
 - Calidad
 - Riesgos
 - Temas pendientes

REUNIÓN DE AVANCE

- Calendario
 - Incluir Calendario planificado y actual.
 - Nivel de calendario acorde a la audiencia.
 - Incluir hitos del último período cumplidos y no cumplidos e hitos del próximo período.
 - Para cada hito, indicar fecha estimada y responsable.

REUNIÓN DE AVANCE

- Esfuerzo
- Comparar esfuerzo presupuestado vs real a la fecha.
- Se debe incluir: Presupuestado total, real hasta hoy, estimado faltante, desvío.

REUNIÓN DE AVANCE

- Avance
- Indicadores que muestren el estado real del proyecto.
- Es preferible mostrar datos concretos y objetivos que porcentajes.

REUNIÓN DE AVANCE

- Indicadores de Avance
- Indicadores de obtención de resultados. Funcionalidad completa.
- Indicadores de avance del trabajo. Evolución de las pruebas.

REUNIÓN DE AVANCE


- Calidad
- Indicadores que muestren estado actual y evolución de la calidad en el proyecto.
- Cantidad de defectos, estado, prioridad.
- Evolución de las pruebas realizadas.

REUNIÓN DE AVANCE

- Calendario
 - Incluir Calendario planificado y actual.
 - Nivel de calendario acorde a la audiencia.
 - Incluir hitos del último período cumplidos y no cumplidos e hitos del próximo período.
 - Para cada hito, indicar fecha estimada y responsable.

VALOR GANADO

- Es el valor presupuestado del trabajo que se completó.
- Cuánto vale lo hecho; independientemente de lo que costó.
- Permite medir la eficiencia y estimar el costo y la duración total.

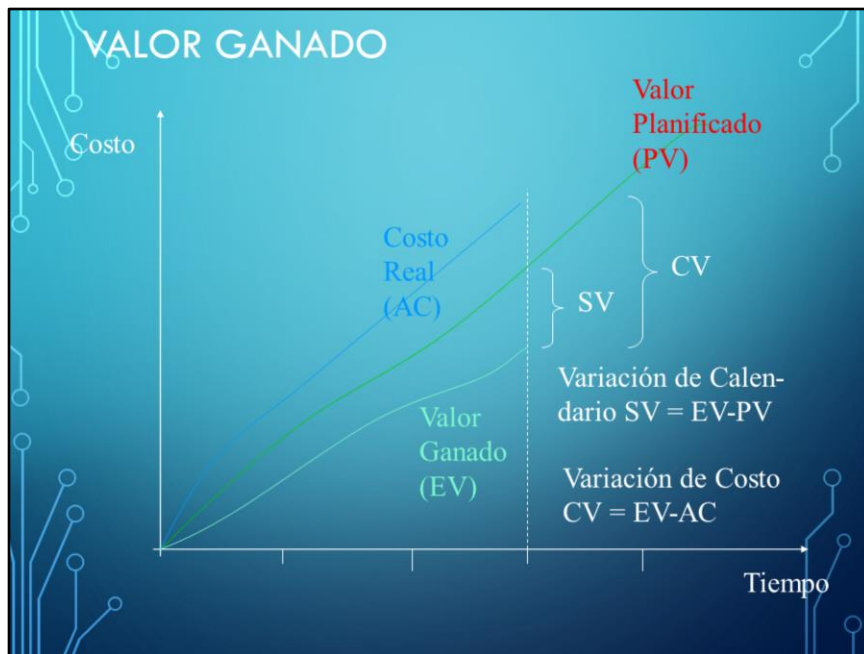

VALOR GANADO - DEFINICIONES

- Valor Planificado (PV ó BCWS). Costo planificado de las actividades para el período en análisis. (¿Cuánto debería haber gastado hasta hoy?)
- Valor Real (AC ó ACWP). Costo real incurrido en el período en análisis. (¿cuánto gasté hasta hoy?)
- Valor Ganado (EV ó BCWP). Costo planificado de las actividades realizadas hasta el día de hoy. (¿Cuánto debería haber gastado para hacer lo que hice?)

VALOR GANADO - DESVÍOS


- Desvío de Costo (CV): Diferencia entre lo que gasté y el beneficio que obtuve.
- Desvío de Calendario (SV): Diferencia entre lo que debería haber gastado y el beneficio que obtuve.

VALOR GANADO - ÍNDICES

- Rendimiento en costo: $CPI = EV / AC$
 - Rendimiento del trabajo: Valor realmente ganado por cada peso invertido.
- Rendimiento en calendario: $SPI = EV / PV$
 - Relación entre lo que hice y lo que debería haber hecho hasta hoy.

VALOR GANADO - PREDICCIONES

- Presupuesto total (BAC): Valor planificado hasta el final del proyecto.
- Costo total (EAC): Cuanto costará el proyecto, teniendo en cuenta el rendimiento real. $EAC = BAC / CPI$

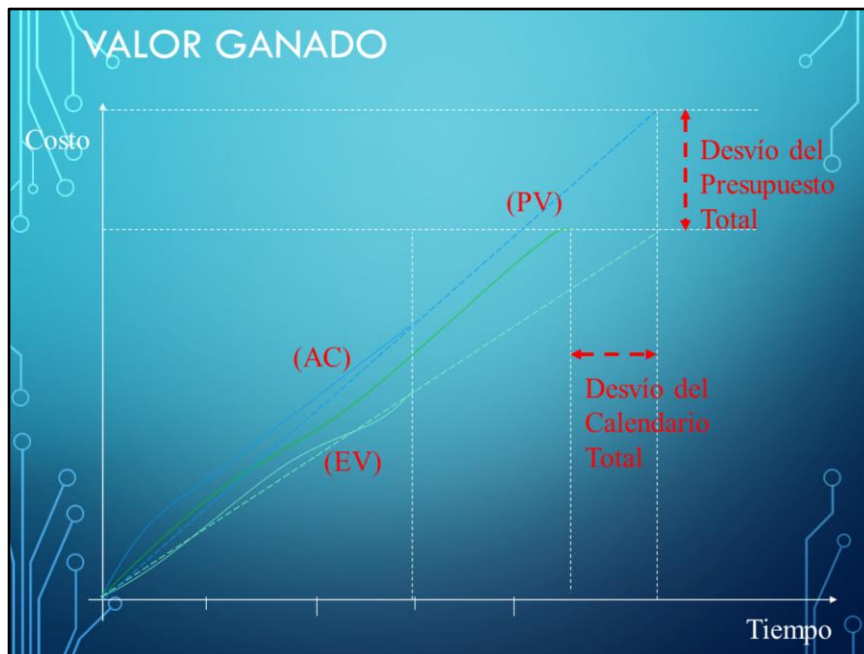

VALOR GANADO

- Reducir ambigüedades: ¿Cuál es el valor ganado de las tareas parcialmente ejecutadas?
- Alternativas:
 - Hasta que no se terminen, valen 0.
 - Mientras están en ejecución, valen el 50%.
 - Estimar un % de la actividad. Reduce la subjetividad al ámbito de la tarea.



PROYECTO BAJO CONTROL

Foco

- Visión: Validar continuamente que todo el equipo tenga la misma visión del proyecto.
- Cliente: Validar que no se pierda la noción de quién es el cliente que pagará por el producto.
- Foco en temas equivocados: Validar que todo el equipo tiene la atención puesta en temas que son importantes para el proyecto.

PROYECTO BAJO CONTROL

Comuni- cación

- Informes de avance: Evitar que se conviertan en descargas de culpa entre los miembros del equipo.
- Falta de comunicación: Validar que todo el equipo está enterado de lo básico del proyecto.
- Evitar el secreto innecesario: Mantener cosas en secreto sin motivo aparente es un síntoma claro de que algo no anda bien

PROYECTO BAJO CONTROL

Proceso

- Falta de hitos y revisiones: Validar la existencia de puntos de control y que éstos sean tangibles.
- Transición de responsabilidades: Verificar que el foco del proyecto transite por los diversos responsables ordenadamente.
- Falla en las métricas a mostrar: Verificar inconsistencias o cambios de métricas a utilizar.

PROYECTO BAJO CONTROL

Equipo

- Dificultades con la tecnología: Verificar que la combinación de especialistas sea la adecuada en cada momento.
- Dificultad para entregar el producto. Es necesario contar con gente experimentada en “entregar” productos.
- Motivación: Moral del equipo. Motivación individual y colectiva para el trabajo.

PROYECTO BAJO CONTROL

Calendario

- Calendario no Bottom-up: Verificar el origen del calendario y las fechas comprometidas.
- “A definir”: Los puntos “a definir” son síntomas de falta de conocimiento o planificación.
- Fechas dobles: Evitar usar dos juegos de fechas, uno externo y otro interno, más temprano que el anterior por falta de confianza en el grupo.
- Considerar otras actividades del equipo: Vacaciones, capacitaciones, otros proyectos.

PROYECTO BAJO CONTROL

Producto

- Alcance: Debe ser modesto e incluir sólo las primeras versiones del producto.
- Performance: No perder de vista el rendimiento y el tamaño del producto que se está construyendo.
- Transición tecnología-producto: Al inicio del proyecto, pesa demasiado la tecnología, por lo novedoso e interesante. Esto debe desaparecer a medida que el producto madura.

