

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of white lines and circles on a blue gradient background, resembling a circuit board or network diagram.

DISEÑO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS II

PROCESO DE ACEPTACIÓN Y LIBERACIÓN.

CIERRE DEL PROYECTO.

Escuela Superior Técnica

PROCESO DE ACEPTACIÓN Y LIBERACIÓN

- El foco de las pruebas pasa de Cobertura a Usabilidad.
- El equipo de Desarrollo trabaja en corregir los defectos remanentes y preparar la Instalación.
- Se incorpora gente de Soporte al equipo de desarrollo.
- El grupo externo que colabora en la estabilización recibe el producto en forma de Betas.

PROCESO DE ACEPTACIÓN Y LIBERACIÓN

- Administración de Defectos en etapas avanzadas de desarrollo.
 - La premisa es abrir el Producto lo menos posible, o no abrirlo.
 - Los defectos se priorizan en equipo, teniendo en cuenta la complejidad de corrección.
 - Se determina qué defectos deben corregirse y cuales no.
 - Prevalece la estabilidad del producto.

PROCESO DE ACEPTACIÓN Y LIBERACIÓN

- Funciones de cada rol:

Jefe de Proyecto

Administración
del Proyecto
Seguimiento de
defectos

Instructor

Capacitación
Material de
capacitación

Desarrollador

Corrección de
Defectos
Transferencia al
Equipo de Soporte

Soporte

Instalación
Recepción del pro-
ducto y conocimiento

Tester

Detección y
Reporte de defectos

Cliente


Detección y
Reporte de defectos
Aprobación

Resp. del Producto

Coordinación de la
prueba
Comunicación

PROCESO DE ACEPTACIÓN Y LIBERACIÓN

- Desde el Producto listo para aprobar, hasta la Liberación en Producción hay una serie de etapas:

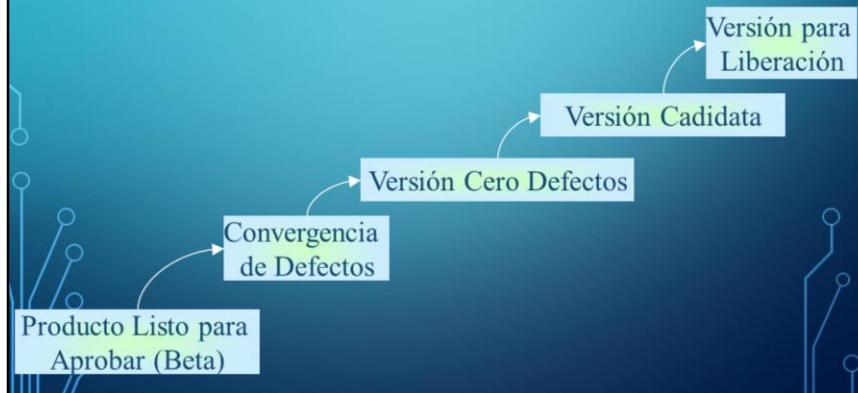

PRODUCTO LISTO PARA APROBAR

- Se completó la estabilización de las pruebas realizadas por el equipo de Prueba.
- La aprobación la realiza el cliente o su representante en un ambiente similar al de Producción.
- Se reportarán defectos de:
 - Ambiente
 - Usabilidad
 - Modalidad de Operación

CONVERGENCIA DE DEFECTOS

- Los defectos corregidos tienden a superar a los detectados.
- Es la primera señal del movimiento hacia la estabilización del producto.
- La convergencia de defectos es más una transición que un punto en el tiempo.

VERSIÓN CERO DEFECTOS

- Todos los defectos críticos han sido corregidos.
- Los demás, han sido suspendidos.
- Debe hacerse una cuidadosa selección de los defectos a corregir.
- Debe llegarse a cero defectos pendientes y mantenerse.




VERSIÓN CANDIDATA

- Se focalizará en corregir únicamente lo crítico remanente.
- Lo que importa en este momento es liberar el producto.


VERSIÓN CANDIDATA

- Se recolectan datos de la versión, y el Equipo puede decidir:
 - Volver a una versión anterior que sea más estable.
 - Liberar una nueva versión al equipo Piloto.
 - Corregir y seguir.
 - Suspender el Piloto hasta que el producto esté más estable.
 - Aceptar la versión y liberarla para producción.

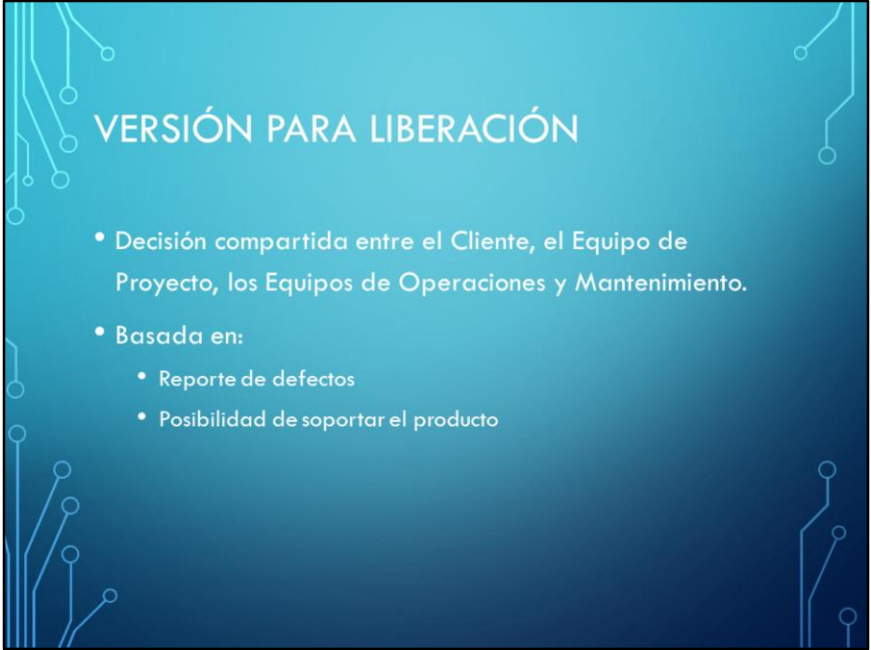

VERSIÓN PARA LIBERACIÓN

- Decisión compartida entre el Cliente, el Equipo de Proyecto, los Equipos de Operaciones y Mantenimiento.
- Basada en:
 - Reporte de defectos
 - Posibilidad de soportar el producto

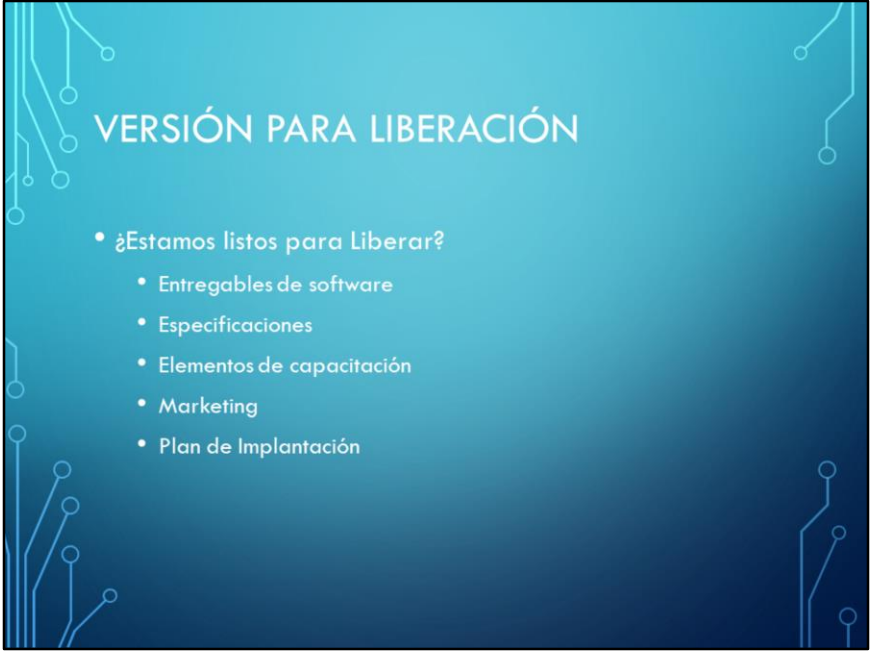

VERSIÓN PARA LIBERACIÓN

- ¿Estamos listos para Liberar?
 - Entregables de software
 - Especificaciones
 - Elementos de capacitación
 - Marketing
 - Plan de Implantación

PROCESO DE ACEPTACIÓN Y LIBERACIÓN

- ¿Qué se libera?
 - Producto de software finalizado.
 - Documento de utilización / capacitación.
 - Documento de instalación / capacitación.
 - Documentación de desarrollo.
 - Códigos fuentes y ejecutables o equivalentes.
 - Registro de defectos remanentes.

POST-LIBERACIÓN

- El Sistema nuevo entra en Régimen.
- Surgen dudas, preguntas y requerimientos de los usuarios.
- El equipo de trabajo está abocado a identificarlos y resolverlos.
- Es necesario marcar un fin. Pasar el control del producto a Operaciones/Mantenimiento.
- No esperar a tener todo resuelto.

CIERRE DEL PROYECTO

- ¿Qué sucedió en el proyecto?
- ¿Fue un proyecto exitoso?
- ¿Quedaron satisfechos los interesados?
- Esto va más allá del resultado de la implementación.

CIERRE DEL PROYECTO.

- Revisión de:
 - Objetivo del proyecto
 - Métricas
 - Estimación y Planificación
 - Imprevistos y soluciones encontradas
 - Administración del Proyecto

INFORME DE CIERRE

- Objetivo del Proyecto
- Resultado obtenido
 - ¿Coinciden? ¿Por qué?
- Equipo del Proyecto
 - ¿Se mantuvo constante?

INFORME DE CIERRE

- Principales métricas:
- Esfuerzo, Calendario:
 - ¿Hubo desvíos? ¿Cuáles fueron las causas?
 - Nuevos requerimientos
 - Retrabajo
 - Planificación muy optimista
 - Equipo muy lento
 - Imprevistos

INFORME DE CIERRE

- Puntos a favor:
 - ¿Qué funcionó bien?
- Inconvenientes encontrados:
 - ¿Qué ocurrió?
 - ¿Qué solución aplicamos?
 - ¿Qué resultados dio?
 - ¿Hubiera sido posible hacer otra cosa?
- Lecciones aprendidas:
 - "Nunca más....."


INFORME DE CIERRE

- Valor agregado para el Cliente:

- Producto
- Conocimiento
- Experiencia
- Servicio

- Valor agregado para nosotros:

- Beneficio económico
- Experiencia
- Capacitación
- Herramientas

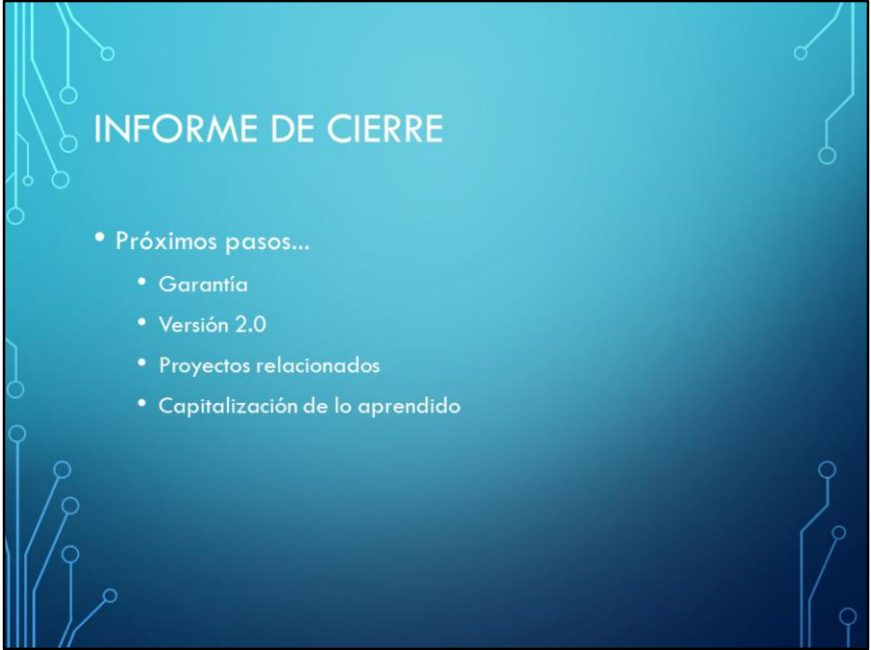

INFORME DE CIERRE

- Próximos pasos...
 - Garantía
 - Versión 2.0
 - Proyectos relacionados
 - Capitalización de lo aprendido
