

Dirección de Proyectos en síntesis

- **Organización y Preparación**

- ☐ Alcance

- ☐ Tiempo – Estimaciones – Cronograma.

- ☐ Costo.

- ☐ CALIDAD

- Entorno Organizacional (ISO 9001)

- Producto (ISO 25000)

- Proceso y Proyecto (ISO/IEC 33000 / ISO/IEC 29110)

- Proceso (vs) Agilidad


PMBOK – Organización y Preparación

Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos				
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución	Grupo de Procesos de Monitoreo y Control	Grupo de Procesos de Cierre
4. Gestión de la Integración del Proyecto	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto	4.5 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 4.6 Realizar el Control Integrado de Cambios	4.7 Cerrar el Proyecto o Fase
5. Gestión del Alcance del Proyecto		5.1 Planificar la Gestión del Alcance 5.2 Recopilar Requisitos 5.3 Definir el Alcance 5.4 Crear la EDT/WBS		5.5 Validar el Alcance 5.6 Controlar el Alcance	
6. Gestión del Cronograma del Proyecto		6.1 Planificar la Gestión del Cronograma 6.2 Definir las Actividades 6.3 Secuenciar las Actividades 6.4 Estimar la Duración de las Actividades 6.5 Desarrollar el Cronograma		6.6 Controlar el Cronograma	

PMBOK – Organización y Preparación

Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

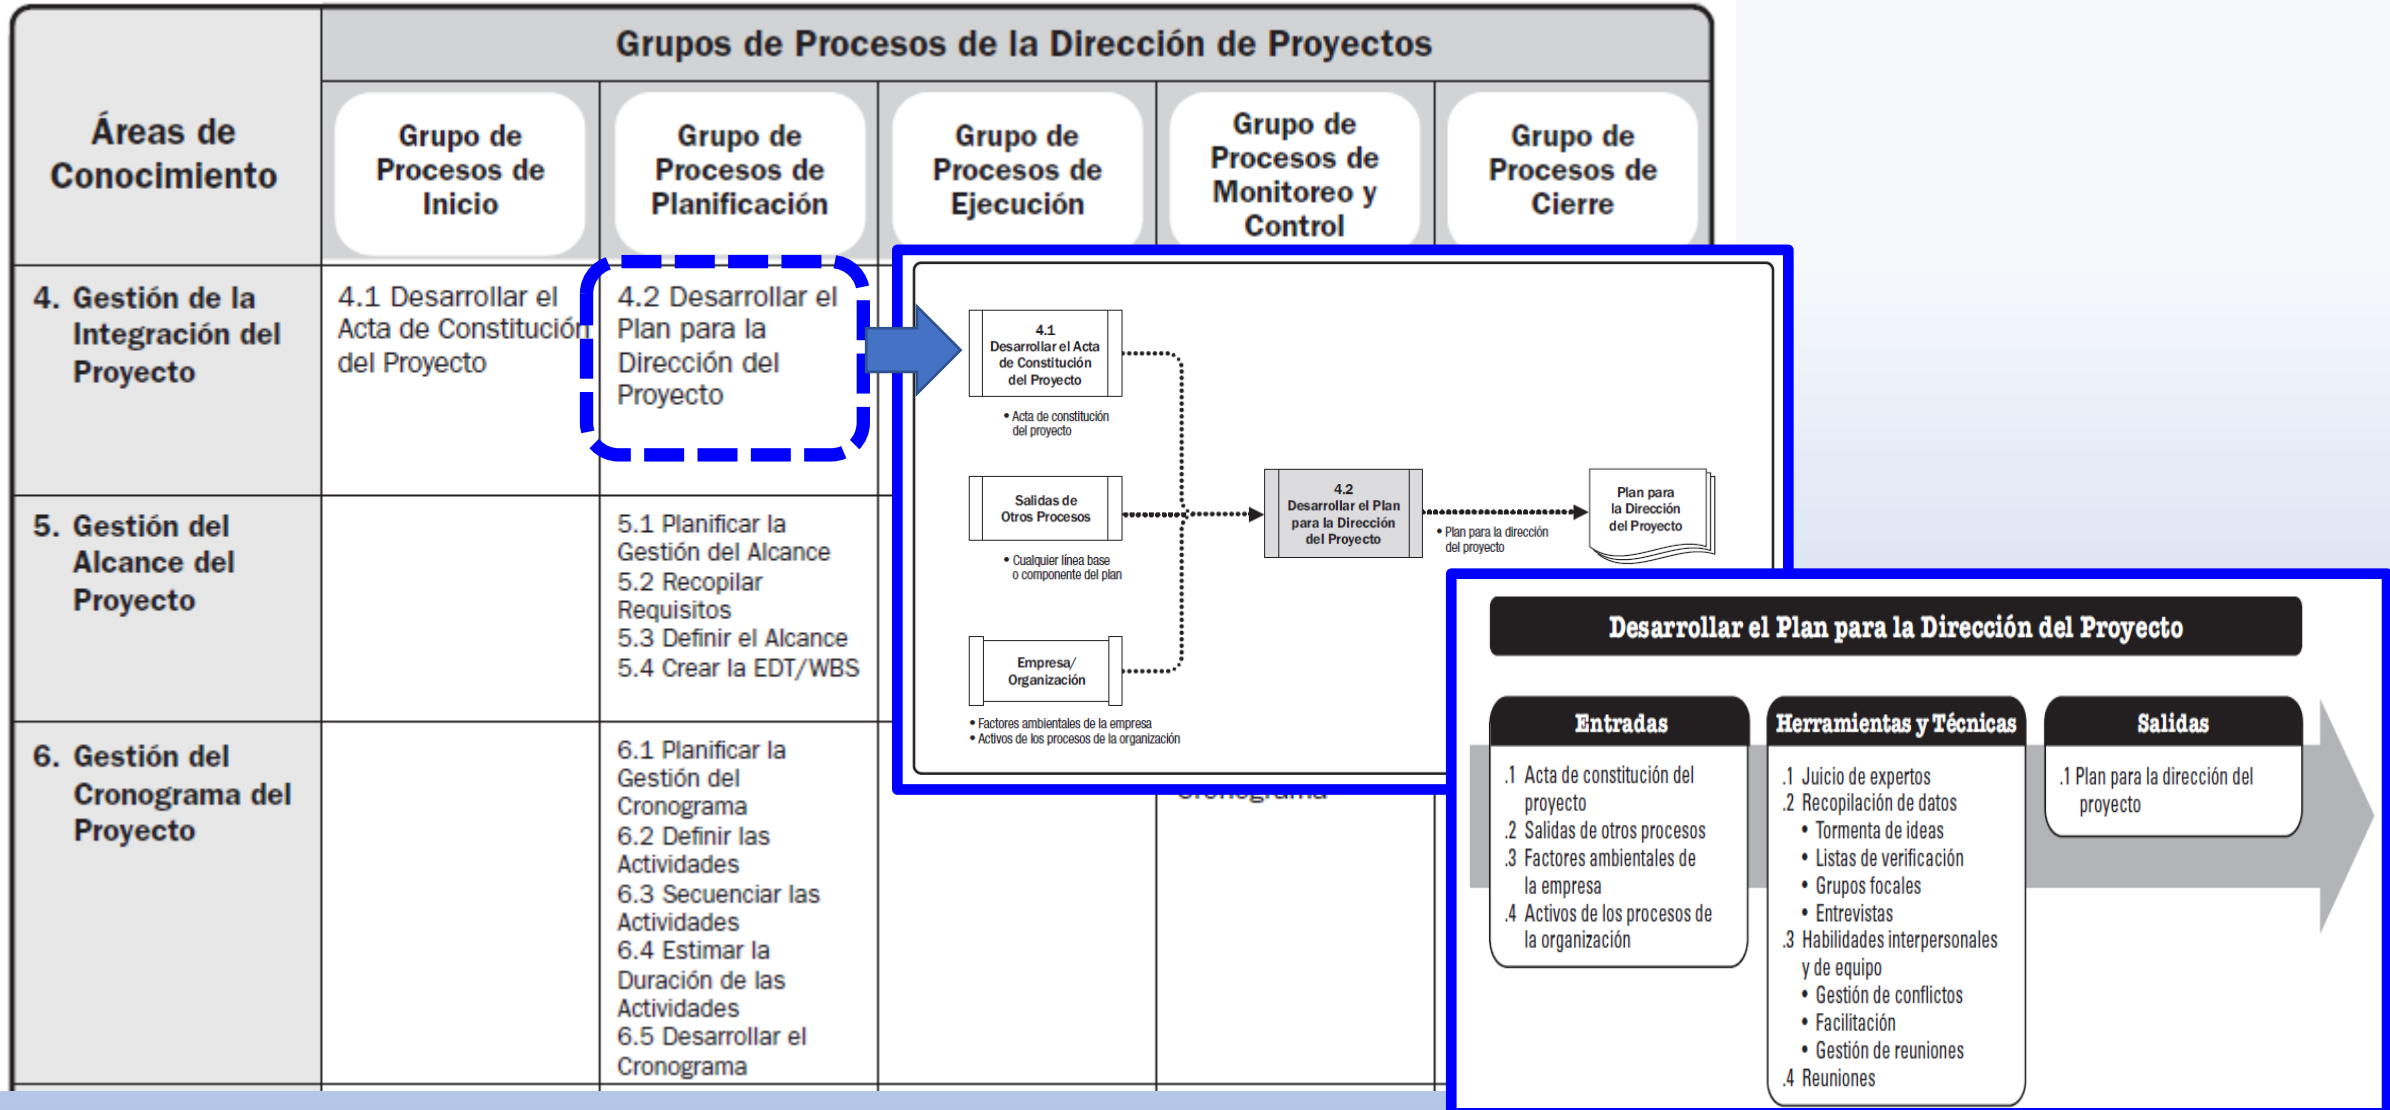

PMBOK – Organización y Preparación

Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos				
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución	Grupo de Procesos de Monitoreo y Control	Grupo de Procesos de Cierre
4. Gestión de la Integración del Proyecto	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto	4.5 Medir el Rendimiento del Proyecto	4.6 Cerrar el Proyecto
5. Gestión del Alcance del Proyecto		5.1 Planificar la Gestión del Alcance 5.2 Recopilar Requisitos 5.3 Definir el Alcance 5.4 Crear la EDT/WBS		5.5 Controlar el Alcance	
6. Gestión del Cronograma del Proyecto		6.1 Planificar la Gestión del Cronograma 6.2 Definir las Actividades 6.3 Secuenciar las Actividades 6.4 Estimar la Duración de las Actividades 6.5 Desarrollar el Cronograma		6.6 Controlar el Cronograma	

Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto

Entradas	Herramientas y Técnicas	Salidas
.1 Acta de constitución del proyecto .2 Salidas de otros procesos .3 Factores ambientales de la empresa .4 Activos de los procesos de la organización	.1 Juicio de expertos .2 Recopilación de datos • Tormenta de ideas • Listas de verificación • Grupos focales • Entrevistas .3 Habilidades interpersonales y de equipo • Gestión de conflictos • Facilitación • Gestión de reuniones .4 Reuniones	.1 Plan para la dirección del proyecto

Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto

PMBOK – Organización y Preparación

Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos			
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución	Grupo de Procesos de Cierre
4. Gestión de la Integración del Proyecto	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	4.3 Gestionar los Recursos del Proyecto 4.4 Gestionar el Proyecto	
5. Gestión del Alcance del Proyecto		5.1 Gestionar el Alcance del Proyecto 5.2 Recopilar los Requisitos del Proyecto 5.3 Definir el Alcance del Proyecto 5.4 Validar el Alcance del Proyecto		
6. Gestión del Cronograma del Proyecto		6.1 Gestionar el Cronograma del Proyecto 6.2 Definir las Actividades del Proyecto 6.3 Definir las Dependencias de las Actividades del Proyecto 6.4 Estimar las Duraciones de las Actividades del Proyecto 6.5 Desarrollar el Cronograma		

Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto

Entradas	Herramientas y Técnicas	Salidas
.1 Acta de constitución del proyecto .2 Salidas de otros procesos .3 Factores ambientales de la empresa .4 Activos de los procesos de la organización	.1 Juicio de expertos .2 Recopilación de datos • Tormenta de ideas • Listas de verificación • Grupos focales • Entrevistas .3 Habilidades personales	.1 Plan para la dirección del proyecto

◆ **Líneas base:**

- **Línea base del alcance.** Descrita en la Sección 5.4.3.1. Versión aprobada de un enunciado del alcance, estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) y su diccionario de la EDT/WBS asociado, que se utiliza como una base de comparación.
- **Línea base del cronograma.** Descrita en la Sección 6.5.3.1. Versión aprobada del modelo de programación que se utiliza como base de comparación con los resultados reales.
- **Línea base de costos.** Descrita en la Sección 7.3.3.1. Versión aprobada del presupuesto del proyecto con fases de tiempo que se utiliza como base de comparación con los resultados reales.

PMBOK – Organización y Preparación

Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos		Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto Entradas Herramientas y Técnicas Salidas		
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación			
4. Gestión de la Integración del Proyecto	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	Entradas .1 Acta de constitución del proyecto .2 Salidas de otros procesos .3 Factores ambientales de la empresa .4 Activos de los procesos de la organización	Herramientas y Técnicas .1 Juicio de expertos .2 Recopilación de datos	Salidas .1 Plan para la dirección del proyecto
5. Gestión del Alcance del Proyecto		5.1 Planificar la Gestión del Alcance 5.2 Recopilar Requisitos 5.3 Definir el Alcance 5.4 Crear la EDT/WBS			
6. Gestión del Cronograma del Proyecto		6.1 Planificar la Gestión del Cronograma 6.2 Definir las Actividades 6.3 Secuenciar las Actividades 6.4 Estimar la Duración de las Actividades 6.5 Desarrollar el Cronograma			6.6 Controlar el Cronograma

◆ Planes de gestión subsidiarios:

- *Plan de gestión del alcance.* Descrito en la Sección 5.1.3.1. Establece el modo en que el alcance será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y validado.
- *Plan de gestión de los requisitos.* Descrito en la Sección 5.1.3.2. Establece cómo se analizarán, documentarán y gestionarán los requisitos.
- *Plan de gestión del cronograma.* Descrito en la Sección 6.1.3.1. Establece los criterios y las actividades a llevar a cabo para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma.
- *Plan de gestión de los costos.* Descrito en la Sección 7.1.3.1. Establece la forma en que se planificarán, estructurarán y controlarán los costos.
- *Plan de gestión de la calidad.* Descrito en la Sección 8.1.3.1. Establece la forma en que las políticas, metodologías y estándares de calidad de una organización se implementarán en el proyecto.
- *Plan de gestión de los recursos.* Descrito en la Sección 9.1.3.1. Proporciona una guía sobre cómo se deberían categorizar, asignar, gestionar y liberar los recursos del proyecto.
- *Plan de gestión de las comunicaciones.* Descrito en la Sección 10.1.3.1. Establece cómo, cuándo y por medio de quién se administrará y difundirá la información del proyecto.
- *Plan de gestión de los riesgos.* Descrito en la Sección 11.1.3.1. Establece el modo en que se estructurarán y se llevarán a cabo las actividades de gestión de riesgos.
- *Plan de gestión de las adquisiciones.* Descrito en la Sección 12.1.3.1. Establece cómo el equipo del proyecto adquirirá bienes y servicios desde fuera de la organización ejecutante.
- *Plan de involucramiento de los interesados.* Descrito en la Sección 13.2.3.1. Establece cómo se involucrará a los interesados en las decisiones y la ejecución del proyecto, según sus necesidades, intereses e impacto.

PMBOK – Organización y Preparación

Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos				
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución	Grupo de Procesos de Monitoreo y Control	Grupo de Procesos de Cierre
4. Gestión de la Integración del Proyecto	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	4.3 Ejecutar el Proyecto	4.4 Monitorear y Controlar el Proyecto	4.5 Cerrar el Proyecto
5. Gestión del Alcance del Proyecto					
6. Gestión del Cronograma del Proyecto					


Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto

Entradas	Herramientas y Técnicas	Salidas
Los componentes desarrollados como parte de este proceso dependerán del proyecto, sin embargo, a menudo incluyen, entre otros: ■ <i>Plan de gestión de cambios.</i> Describe el modo en que se autorizarán e incorporarán formalmente las solicitudes de cambio a lo largo del proyecto. ■ <i>Plan de gestión de la configuración.</i> Describe la manera en que la información sobre los elementos del proyecto, así como cuáles elementos, serán registrados y actualizados de modo que el producto, servicio o resultado del proyecto se mantenga consistente y/u operativo. ■ <i>Línea base para la medición del desempeño.</i> Un plan integrado a nivel de alcance-cronograma-costos para el trabajo del proyecto, con el cual se compara la ejecución del proyecto para medir y gestionar el desempeño. ■ <i>Ciclo de vida del proyecto.</i> Describe la serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. ■ <i>Enfoque de desarrollo.</i> Describe el enfoque de desarrollo del producto, servicio o resultado, tal como un modelo predictivo, iterativo, ágil o híbrido. ■ <i>Revisiones de la gestión.</i> Identifica los puntos del proyecto en que el director del proyecto y los interesados relevantes revisarán el avance del proyecto para determinar si el desempeño es el esperado, o si son necesarias acciones preventivas o correctivas.	Los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etc.	1. Plan para la dirección del proyecto

PMBOK – Organización y Preparación


Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos				
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución	Grupo de Procesos de Monitoreo y Control	Grupo de Procesos de Cierre
4. Gestión de la Integración del Proyecto	4. A. d	Plan para la Dirección del Proyecto		Documentos del Proyecto	
		1. Plan para la gestión del alcance	1. Atributos de la actividad	19. Mediciones de control de calidad	
		2. Plan de gestión de los requisitos	2. Lista de actividades	20. Métricas de calidad	
		3. Plan de gestión del cronograma	3. Registro de supuestos	21. Informe de calidad	
		4. Plan de gestión de los costos	4. Base de las estimaciones	22. Documentación de requisitos	
5. Gestión del Alcance del Proyecto		5. Plan de gestión de la calidad	5. Registro de cambios	23. Matriz de trazabilidad de requisitos	
		6. Plan de gestión de los recursos	6. Estimaciones de costos	24. Estructura de desglose de recursos	
		7. Plan de gestión de las comunicaciones	7. Pronósticos de costos	25. Calendarios de recursos	
		8. Plan de gestión de los riesgos	8. Estimaciones de la duración	26. Requisitos de recursos	
		9. Plan de gestión de las adquisiciones	9. Registro de incidentes	27. Registro de riesgos	
6. Gestión del Cronograma del Proyecto		10. Plan de involucramiento de los interesados	10. Registro de lecciones aprendidas	28. Informe de riesgos	
		11. Plan de gestión de cambios	11. Lista de hitos	29. Datos del cronograma	
		12. Plan de gestión de la configuración	12. Asignaciones de recursos físicos	30. Pronósticos del cronograma	
		13. Línea base del alcance	13. Calendarios del proyecto	31. Registro de interesados	
		14. Línea base del cronograma	14. Comunicaciones del proyecto	32. Acta de constitución del equipo	
		15. Línea base de costos	15. Cronograma del proyecto,	33. Documentos de prueba y evaluación	
		16. Línea base para la medición del desempeño	16. Diagrama de red del cronograma del proyecto		
		17. Descripción del ciclo de vida del proyecto	17. Enunciado del alcance del proyecto		
		18. Enfoque de desarrollo	18. Asignaciones del equipo del proyecto		

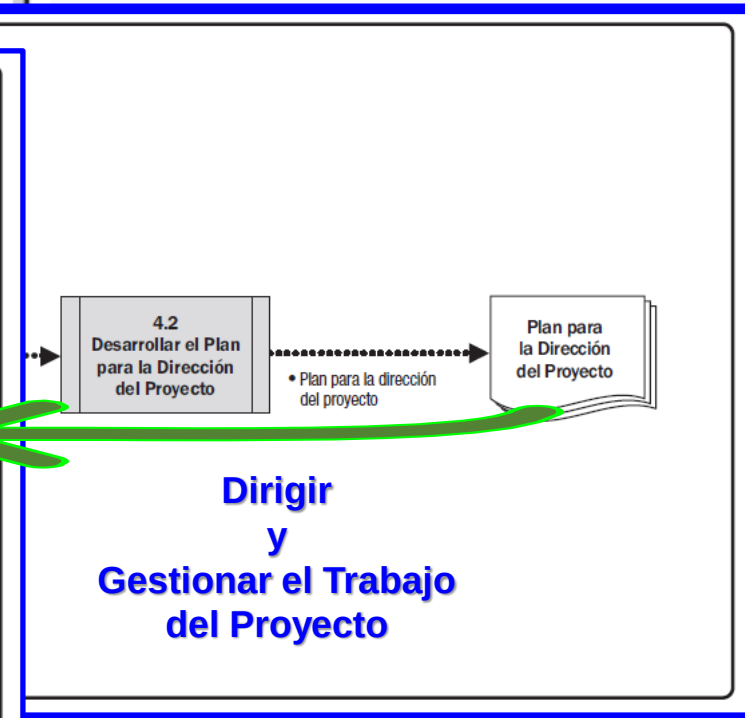


PMBOK – “Triángulo de Hierro de PM”

TRIPLE RESTRICCIÓN BÁSICA

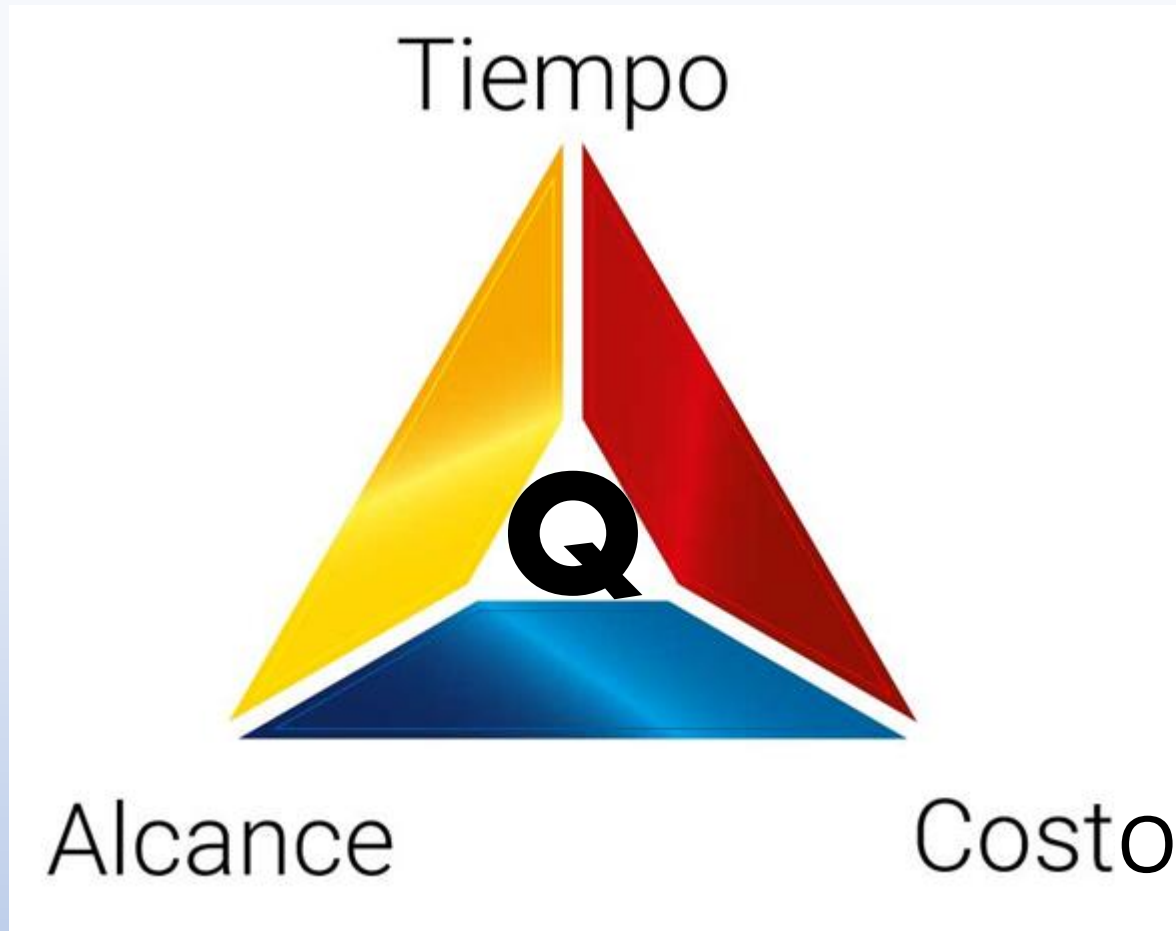

TRIPLE RESTRICCIÓN **AMPLIADA**

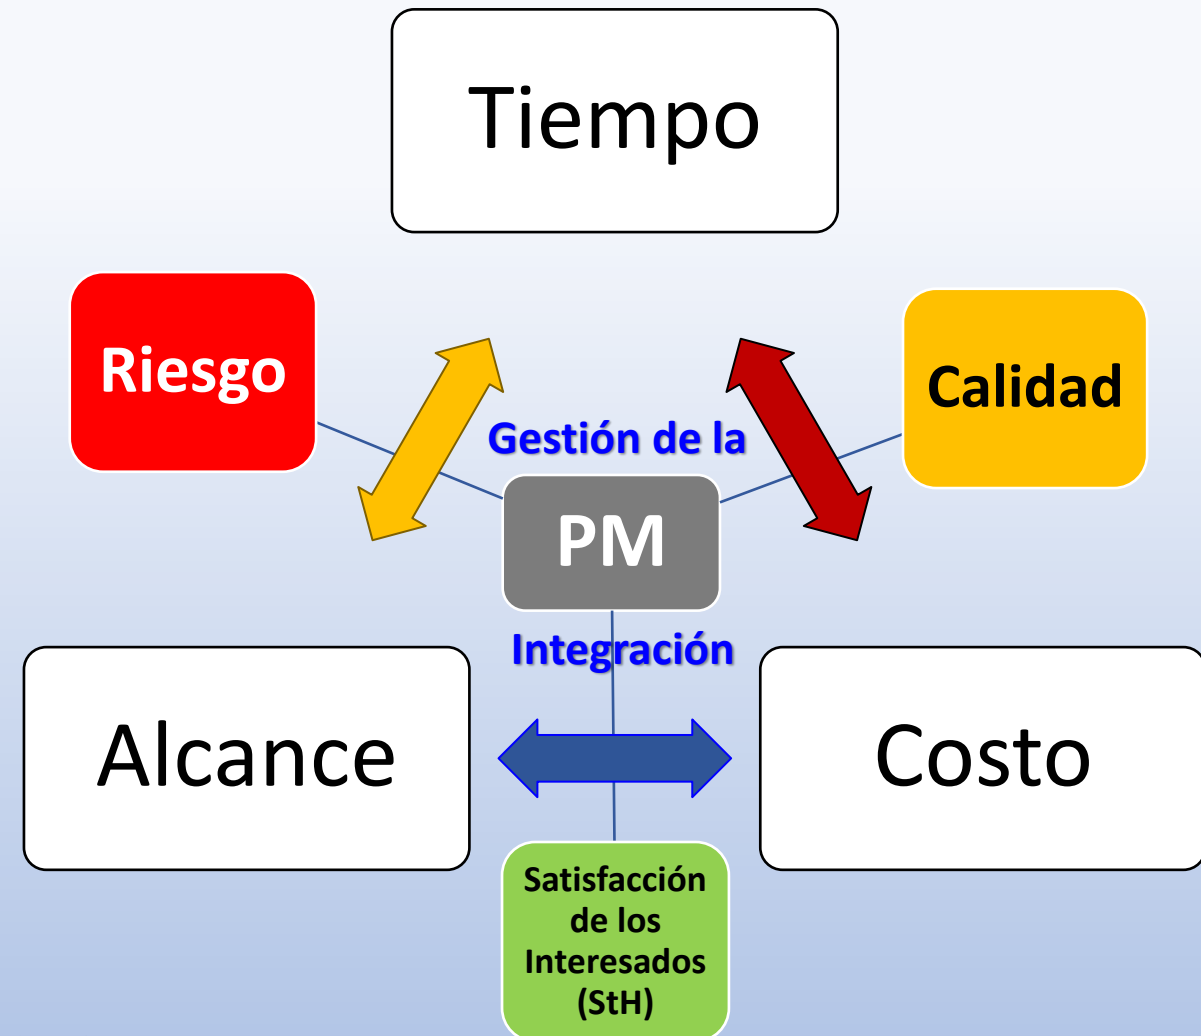

Dirección de Proyectos en síntesis

• Organización y Preparación

☐ Alcance

☐ Tiempo – Estimaciones – Cronograma.

☐ Costo.

☐ CALIDAD


- Entorno Organizacional (ISO 9001)
- Producto (ISO 25000)
- Proceso y Proyecto (ISO/IEC 33000 / ISO/IEC 29110)
- Proceso (vs) Agilidad

- ◆ **Descripción del alcance del producto.** Esta descripción elabora gradualmente las características del producto, servicio o resultado descrito en el acta de constitución del proyecto y en la documentación de requisitos.
- ◆ **Entregables.** Cualquier producto, resultado o capacidad único y verificable para ejecutar un servicio que se debe producir para completar un proceso, una fase o un proyecto. Los entregables también incluyen resultados complementarios, tales como los informes y la documentación de dirección del proyecto. Estos entregables se pueden describir de manera resumida o muy detallada.
- ◆ **Criterios de aceptación.** Conjunto de condiciones que debe cumplirse antes de que se acepten los entregables.
- ◆ **Exclusiones del proyecto.** Identifica lo que está excluido del proyecto. Establecer explícitamente lo que está fuera del alcance del proyecto ayuda a gestionar las expectativas de los interesados y puede reducir la corrupción o deslizamiento del alcance.

PMBOK – Organización y Preparación


Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyecto

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyecto			
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución	Grupo de Procesos de Monitoreo y Control
4. Gestión de la Integración del Proyecto	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto	4.5 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 4.6 Realizar el Control Integrado de Cambios
5. Gestión del Alcance del Proyecto		5.1 Planificar la Gestión del Alcance 5.2 Recopilar Requisitos 5.3 Definir el Alcance 5.4 Crear la EDT/WBS		5.5 Validar el Alcance 5.6 Controlar el Alcance
6. Gestión del Cronograma del Proyecto		6.1 Planificar la Gestión del Cronograma 6.2 Definir las Actividades 6.3 Secuenciar las Actividades 6.4 Estimar la Duración de las Actividades 6.5 Desarrollar el Cronograma		6.6 Controlar el Cronograma

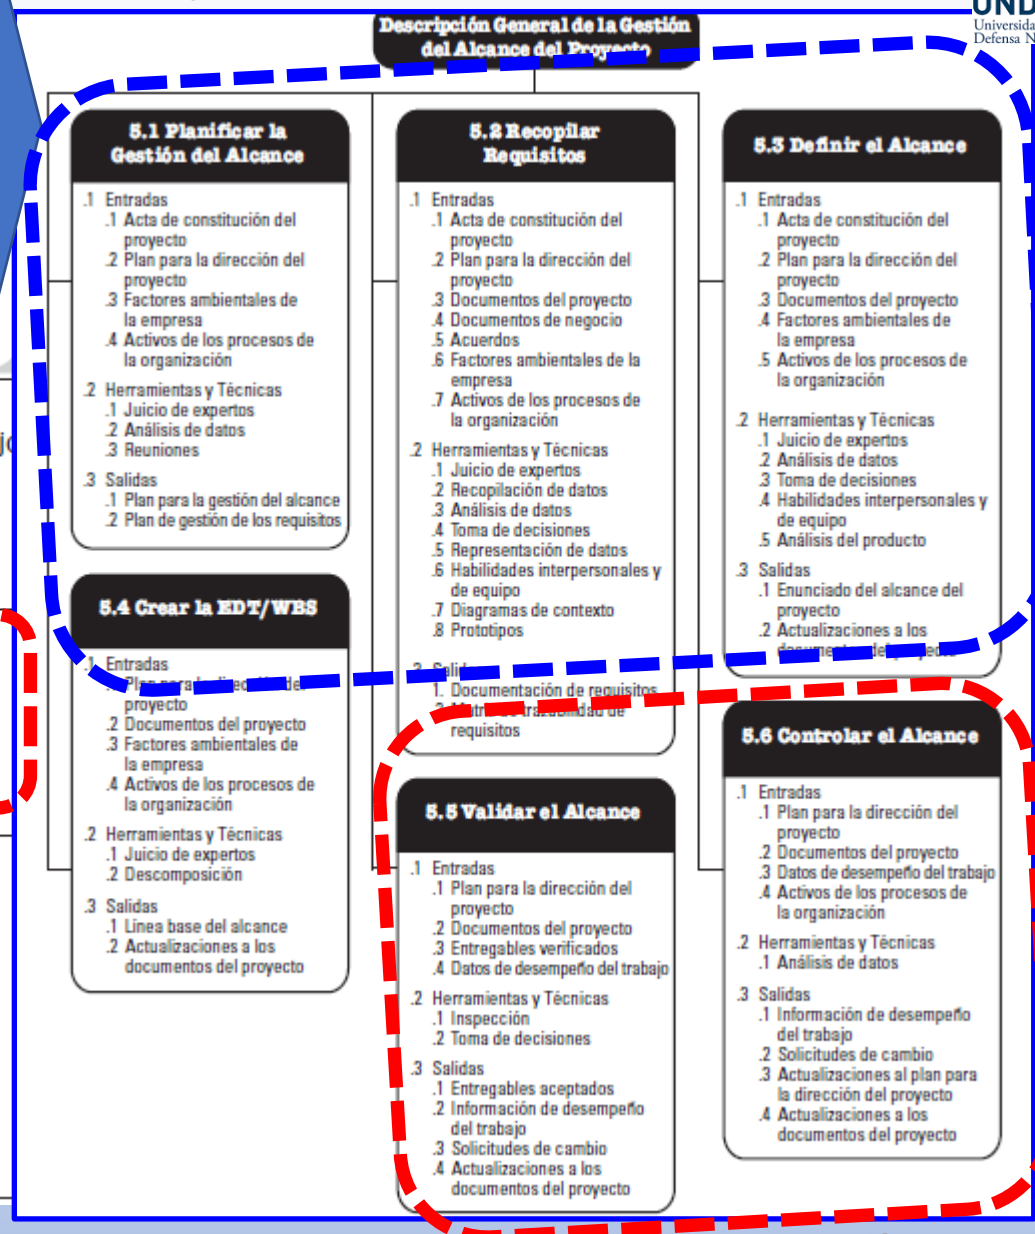

PMBOK – Organización y Preparación

Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

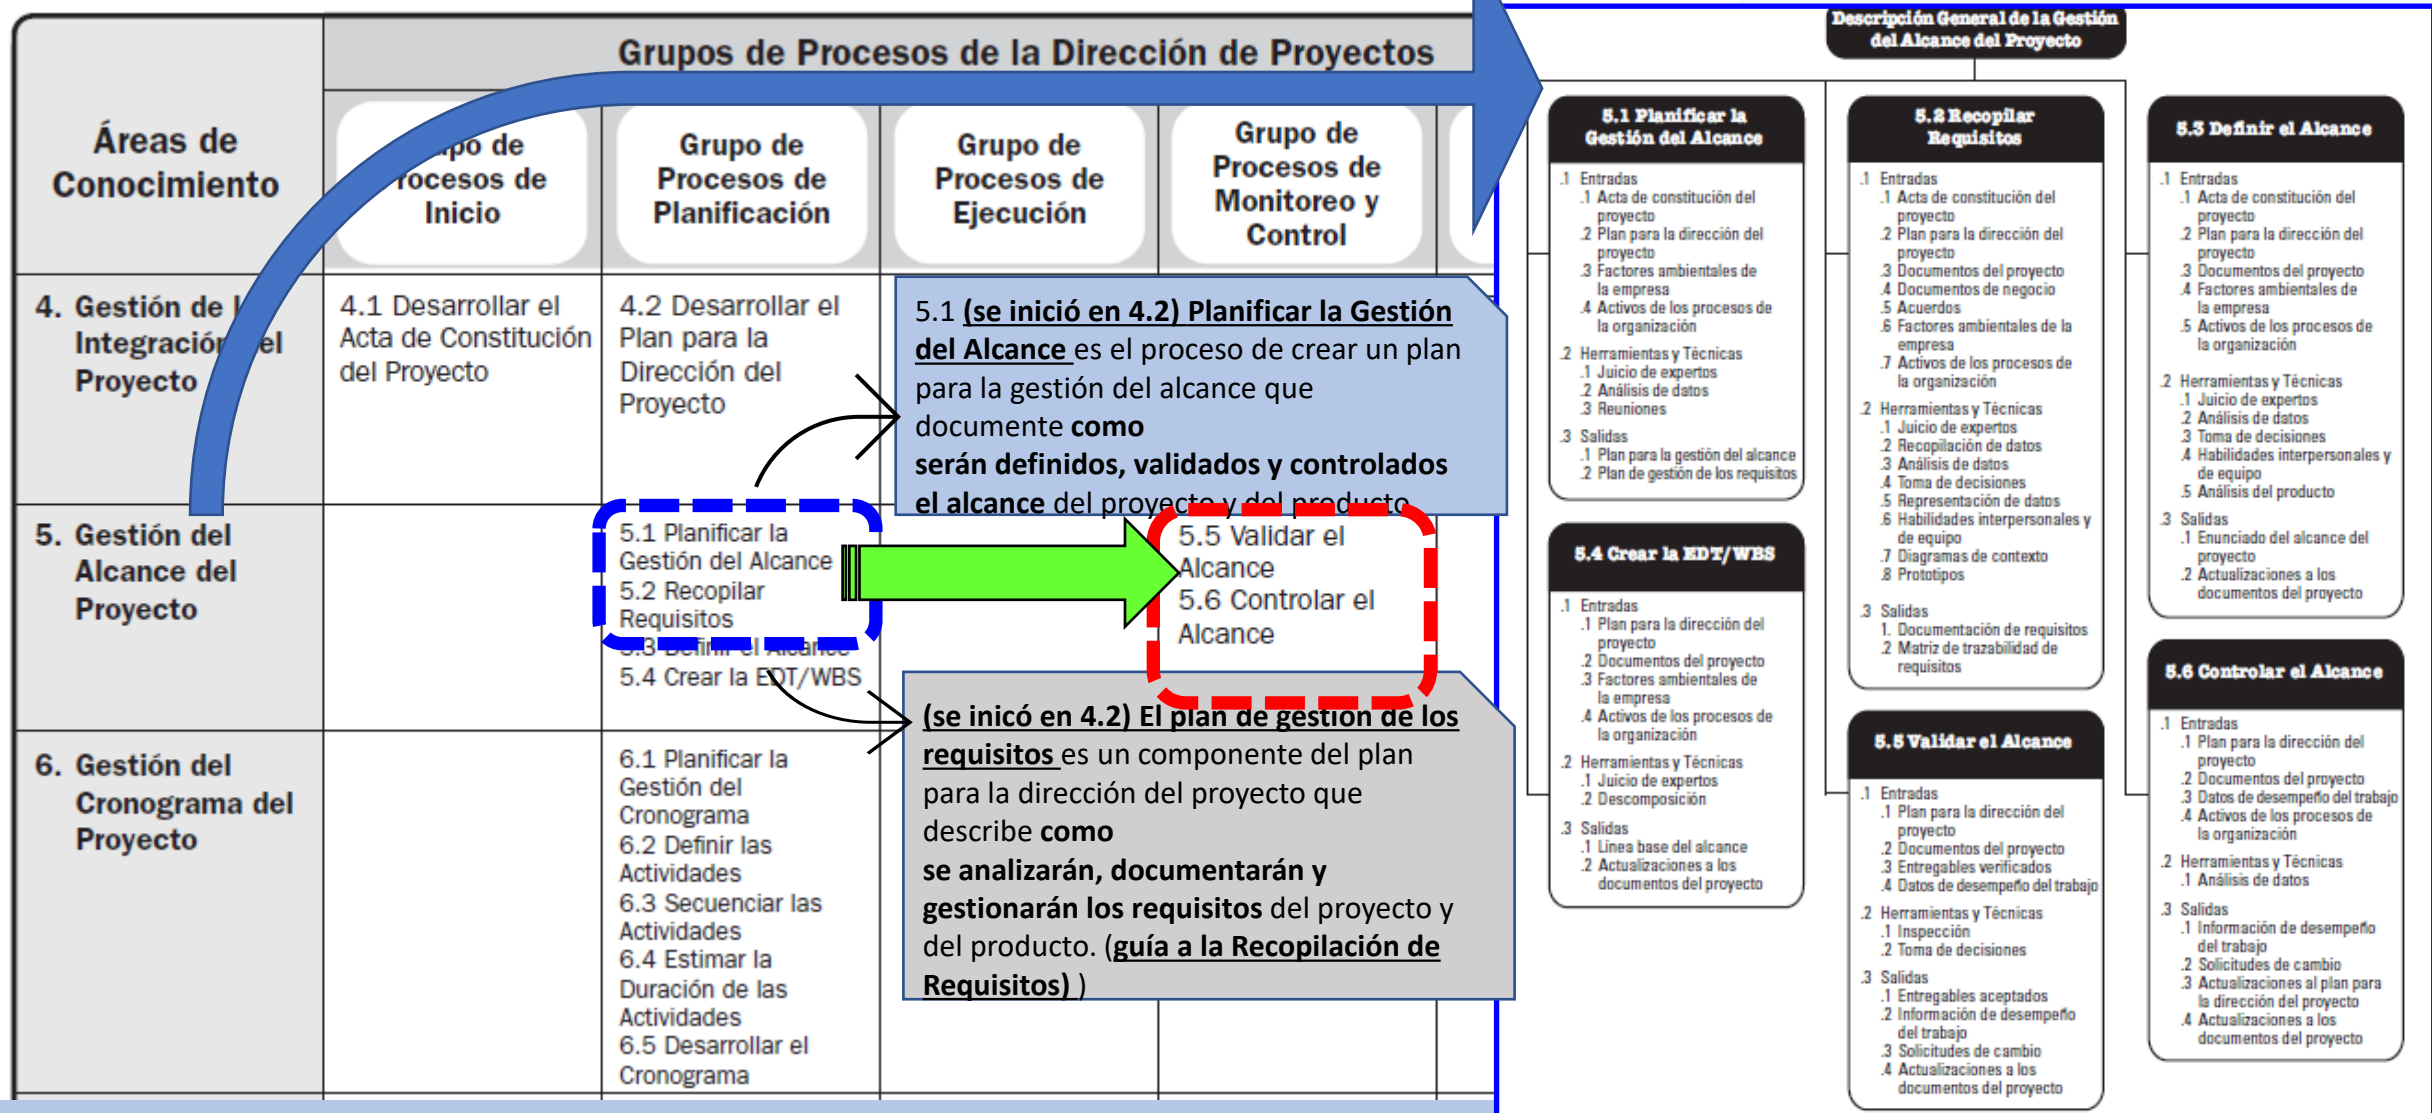

PMBOK – Organización y Preparación

Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos	
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación
4. Gestión de la Integración del Proyecto	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto
5. Gestión del Alcance del Proyecto		5.1 Planificar la Gestión del Alcance 5.2 Recopilar Requisitos 5.3 Definir el Alcance 5.4 Crear la EDT/WBS
6. Gestión del Cronograma del Proyecto		6.1 Planificar la Gestión del Cronograma 6.2 Definir las Actividades 6.3 Secuenciar las Actividades 6.4 Estimar la Duración de las Actividades 6.5 Desarrollar el Cronograma

Recopilar Requisitos		
Entradas	Herramientas y Técnicas	Salidas
.1 Acta de constitución del proyecto .2 Plan para la dirección del proyecto • Plan para la gestión del alcance • Plan de gestión de los requisitos • Plan de involucramiento de los interesados .3 Documentos del proyecto • Registro de supuestos • Registro de lecciones aprendidas • Registro de interesados .4 Documentos de negocio del proyecto • Caso de negocio .5 Acuerdos .6 Factores ambientales de la empresa .7 Activos de los procesos de la organización	.1 Juicio de expertos .2 Recopilación de datos • Tormenta de ideas • Entrevistas • Grupos focales • Cuestionarios y encuestas • Estudios comparativos .3 Análisis de datos • Análisis de documentos .4 Toma de decisiones	.1 Documentación de requisitos


Los requisitos deben ser **inequívocos** (medibles y comprobables), **trazables**, **completos**, **coherentes** y **aceptables** para los *interesados clave*.

- Requisitos del **negocio**.
- Requisitos de los **interesados**.
- Requisitos de las **soluciones**.
 - Requisitos **funcionales** (del negocio).
 - Requisitos **no funcionales** (atributos de calidad).
- Requisitos de **transición y preparación**.
- Requisitos del **proyecto**.
- Requisitos de **calidad** (del proyecto).

PMBOK – Organización y Preparación

Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

Matriz de Trazabilidad de Requisitos								
Nombre del Proyecto:								
Centro de Costos:								
Descripción del Proyecto:								
ID	ID de Asociado	Descripción de los Requisitos	Necesidades, Oportunidades, Metas y Objetivos del Negocio	Objetivos del Proyecto	Entregables de la EDT/WBS	Diseño del Producto	Desarrollo del Producto	Casos de Prueba
001	1.0							
	1.1							
	1.2							
	1.2.1							
002	2.0							
	2.1							
	2.1.1							
003	3.0							
	3.1							
	3.2							
004	4.0							
005	5.0							

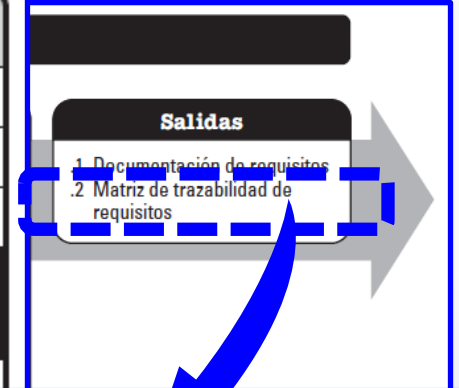

- Requisitos del **negocio**.
- Requisitos de los **interesados**.
- Requisitos de las **soluciones**.
 - Requisitos **funcionales** (del negocio).
 - Requisitos **no funcionales** (atributos de calidad).
- Requisitos de **transición y preparación**.
- Requisitos del **proyecto**.
- Requisitos de **calidad** (del proyecto).

Los requisitos deben ser **inequívocos** (medibles y comprobables), **trazables**, **completos**, **coherentes** y **aceptables** para los *interesados clave*.

PMBOK – Organización y Preparación

Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos			Acta de Constitución del Proyecto	Enunciado del Alcance del Proyecto
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución		
4. Gestión de la Integración del Proyecto	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	4.3 Gestionar el Proyecto 4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto	Propósito del proyecto Los objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito asociados Los requisitos de alto nivel La descripción de alto nivel del proyecto, los límites y los entregables clave El riesgo general del proyecto El resumen del cronograma de hitos Recursos financieros preaprobados La lista de interesados clave Los requisitos de aprobación del proyecto (es decir, en qué consiste el éxito del proyecto, quién decide si el proyecto tiene éxito y quién firma la aprobación del proyecto) Los criterios de salida del proyecto (es decir, qué condiciones deben cumplirse a fin de cerrar o cancelar el proyecto o fase) El director del proyecto asignado, su responsabilidad y su nivel de autoridad El nombre y el nivel de autoridad del patrocinador o de quienes autorizan el acta de constitución del proyecto	Descripción del alcance del proyecto (elaborado progresivamente) Entregables del proyecto Criterios de aceptación Exclusiones del proyecto
5. Gestión del Alcance del Proyecto		5.1 Planificar la Gestión del Alcance 5.2 Recopilar Requisitos 5.3 Definir el Alcance 5.4 Crear la EOT, WBS			
6. Gestión del Cronograma del Proyecto		6.1 Planificar la Gestión del Cronograma 6.2 Definir las Actividades 6.3 Secuenciar las Actividades 6.4 Estimar la Duración de las Actividades 6.5 Desarrollar el Cronograma			

PMBOK – Organización y Preparación

Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos			Acta de Constitución del Proyecto	Enunciado del Alcance del Proyecto
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución		
4. Gestión de la Integración del Proyecto	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	4.3 Dirigir y Gestionar el Proyecto	Propósito del proyecto Los objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito asociados Los requisitos de alto nivel La descripción de alto nivel del proyecto, los límites, los entregables, los	Descripción del alcance del proyecto (elaborado progresivamente) Entregables del proyecto Criterios de aceptación Exclusiones del proyecto
5. Gestión del Alcance del Proyecto					
6. Gestión de los Recursos del Proyecto					

- ◆ **Descripción del alcance del producto.** Esta descripción elabora gradualmente las características del producto, servicio o resultado descrito en el acta de constitución del proyecto y en la documentación de requisitos.
- ◆ **Entregables.** Cualquier producto, resultado o capacidad único y verificable para ejecutar un servicio que se debe producir para completar un proceso, una fase o un proyecto. Los entregables también incluyen resultados complementarios, tales como los informes y la documentación de dirección del proyecto. Estos entregables se pueden describir de manera resumida o muy detallada.
- ◆ **Criterios de aceptación.** Conjunto de condiciones que debe cumplirse antes de que se acepten los entregables.
- ◆ **Exclusiones del proyecto.** Identifica lo que está excluido del proyecto. Establecer explícitamente lo que está fuera del alcance del proyecto ayuda a gestionar las expectativas de los interesados y puede reducir la corrupción o deslizamiento del alcance.

PMBOK – Organización y Preparación

Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

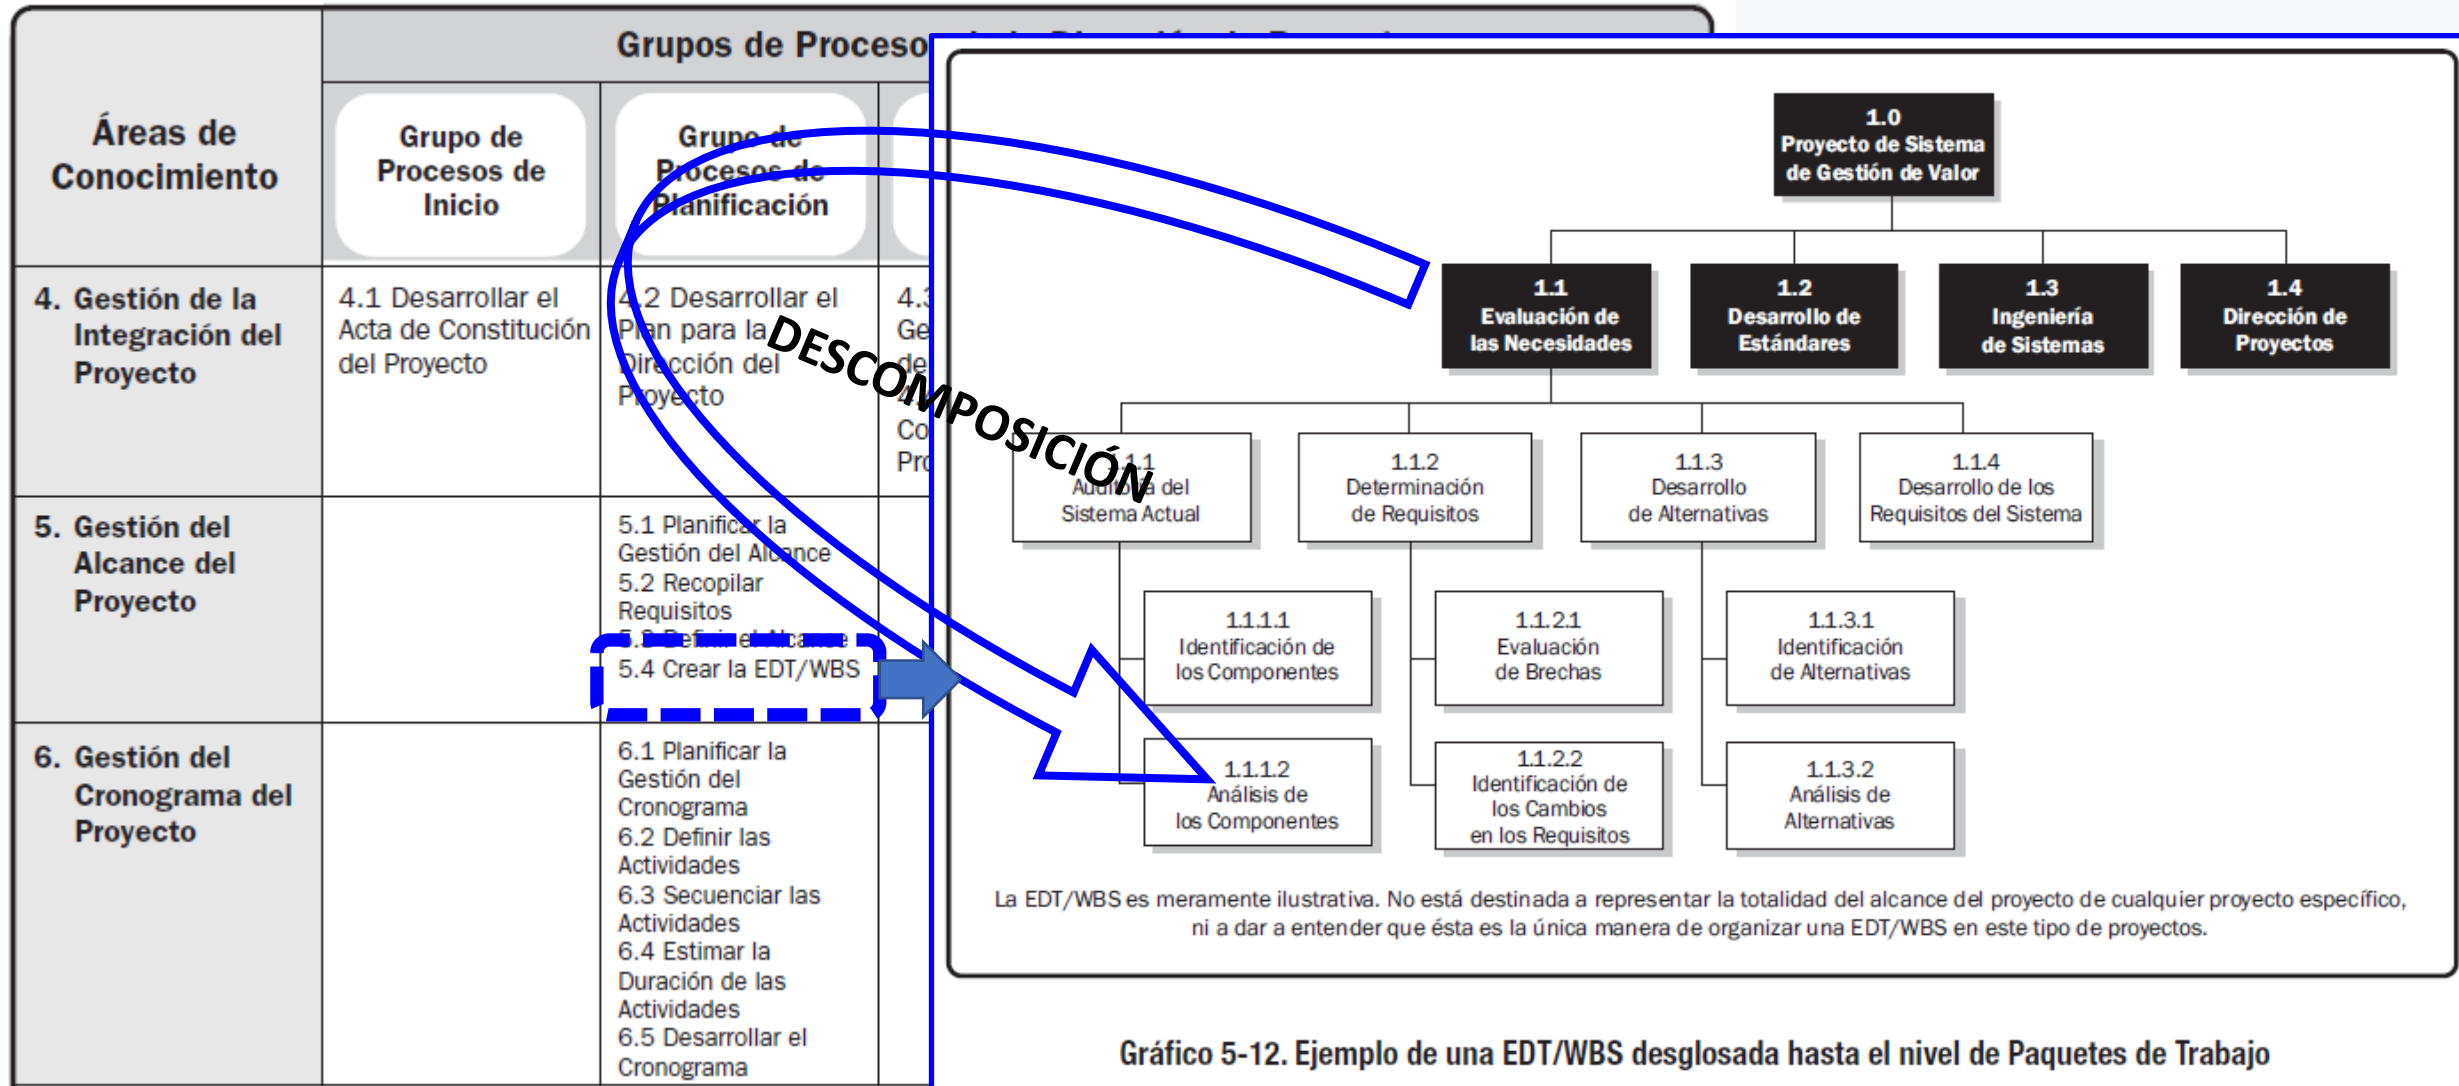


Gráfico 5-12. Ejemplo de una EDT/WBS desglosada hasta el nivel de Paquetes de Trabajo

PMBOK – Organización y Preparación

Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

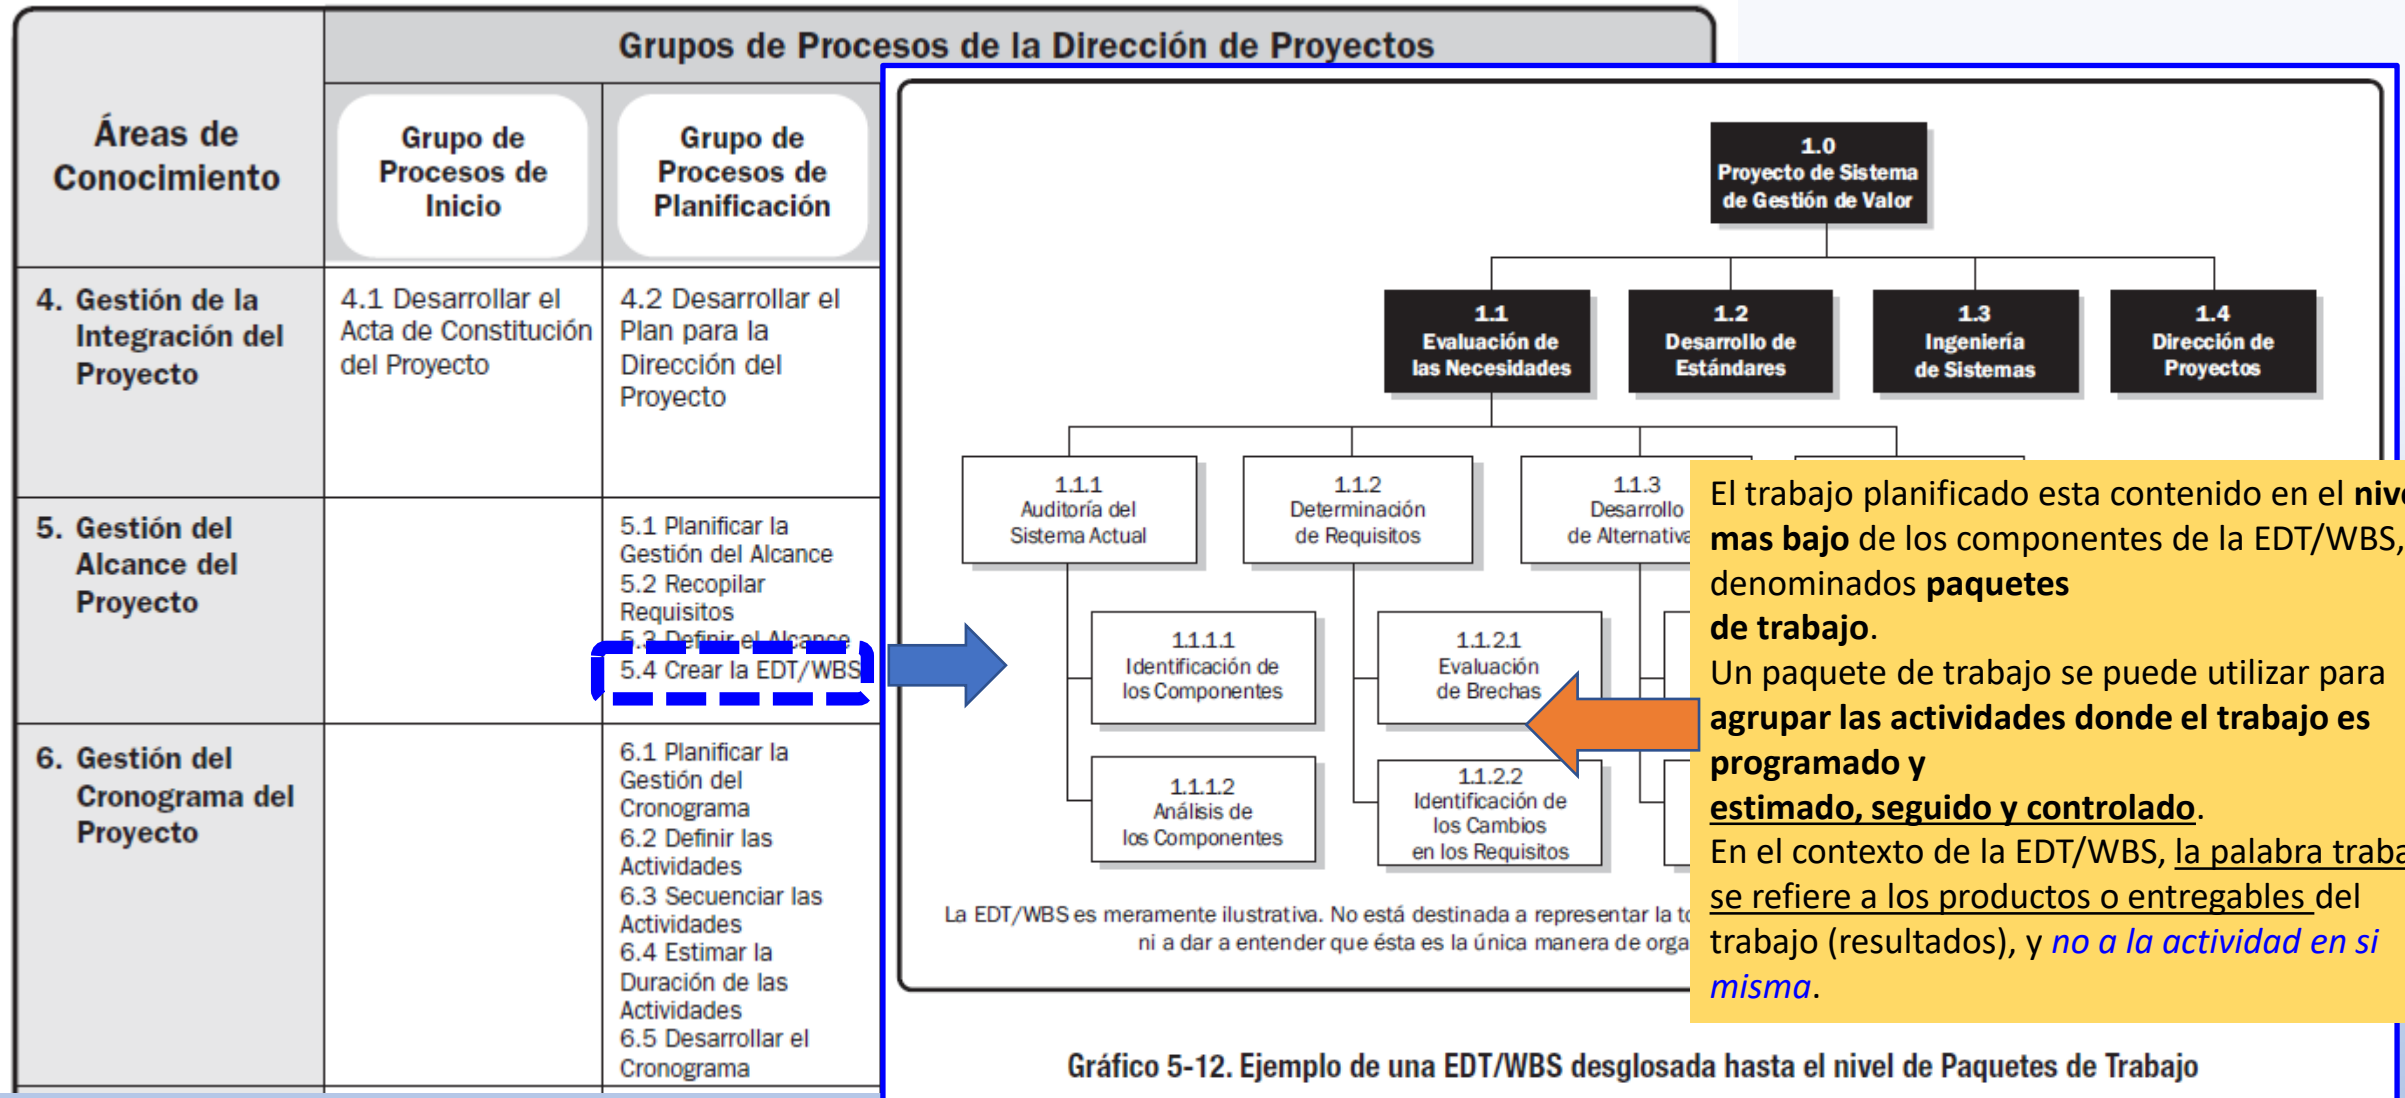


Gráfico 5-12. Ejemplo de una EDT/WBS desglosada hasta el nivel de Paquetes de Trabajo

PMBOK – Organización y Preparación

Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos de PMBOK y Áreas de Conocimiento

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos	
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación
4. Gestión de la Integración del Proyecto	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto
5. Gestión del Alcance del Proyecto		5.1 Planificar la Gestión del Alcance 5.2 Recopilar Requisitos 5.3 Definir el WBS 5.4 Crear la EDT
6. Gestión del Cronograma del Proyecto		6.1 Planificar la Gestión del Cronograma 6.2 Definir las Actividades 6.3 Secuenciar Actividades 6.4 Estimar la Duración de las Actividades 6.5 Desarrollar el Cronograma

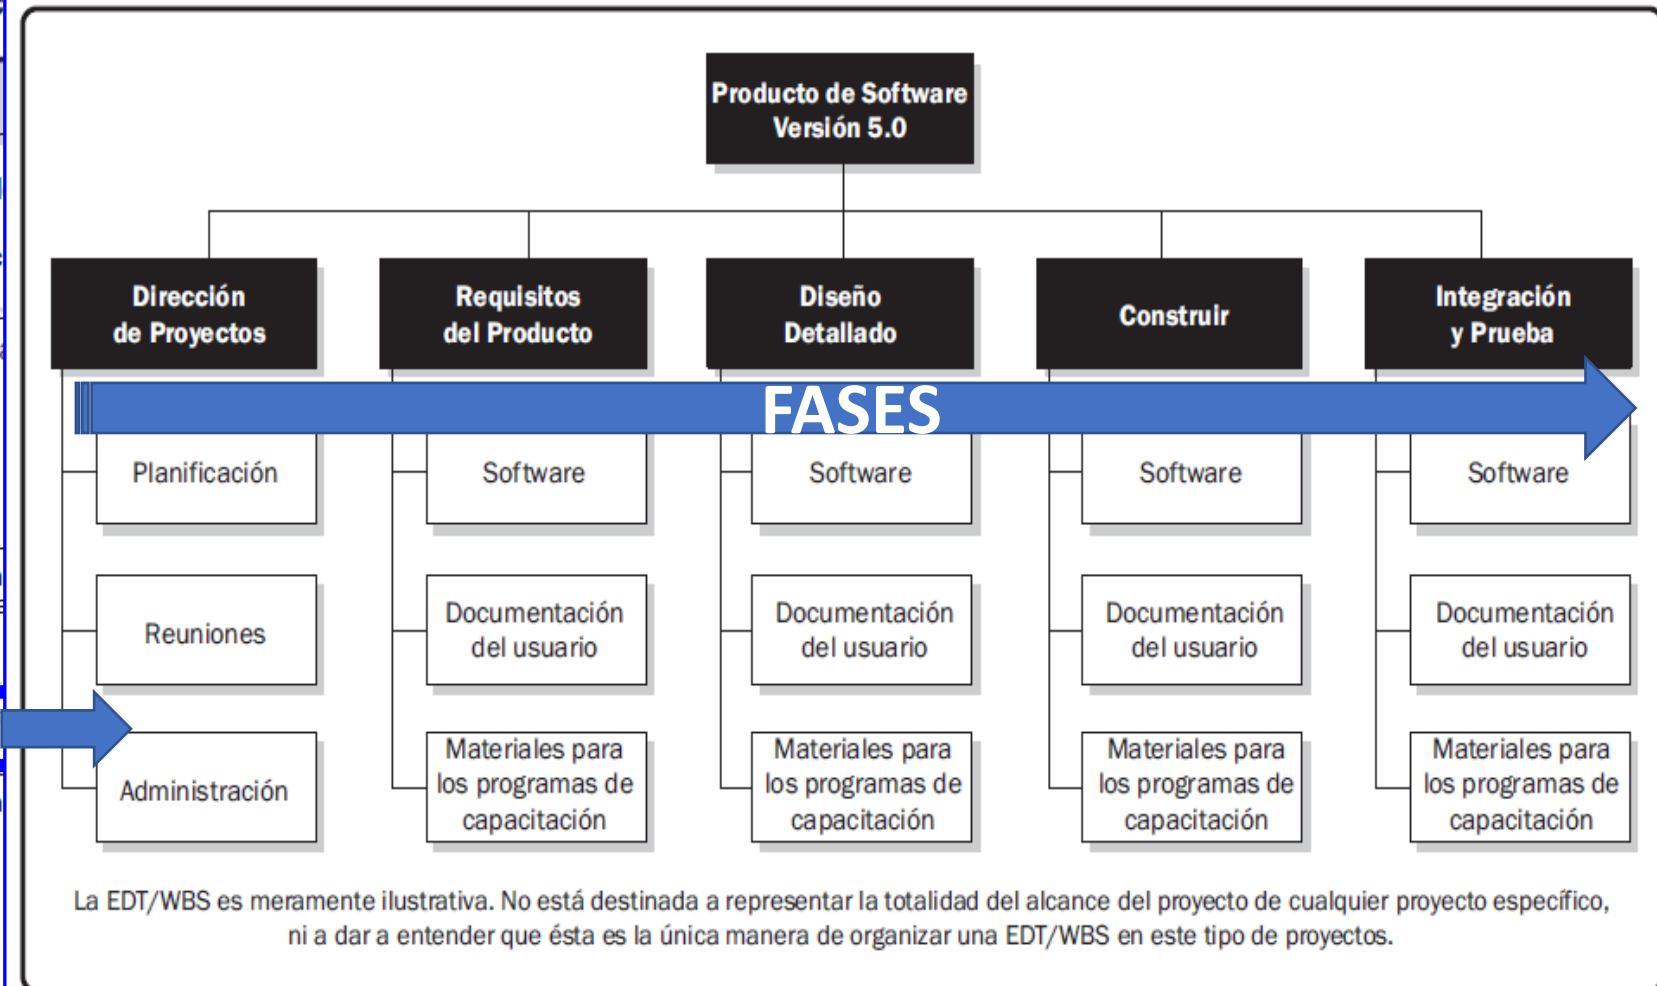


Gráfico 5-13. Ejemplo de una EDT/WBS organizada por Fases

PMBOK – Organización y Preparación

Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos

Áreas de Conocimiento	Grupos de	
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación
4. Gestión de la Integración del Proyecto	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar Plan para la Dirección del Proyecto
5. Gestión del Alcance del Proyecto		5.1 Planificar la Gestión del Alcance 5.2 Recopilar Requisitos 5.3 Definir el Alcance 5.4 Crear la EDT
6. Gestión del Cronograma del Proyecto		6.1 Planificar la Gestión del Cronograma 6.2 Definir las Actividades 6.3 Secuenciar las Actividades 6.4 Estimar la Duración de las Actividades 6.5 Desarrollar el Cronograma

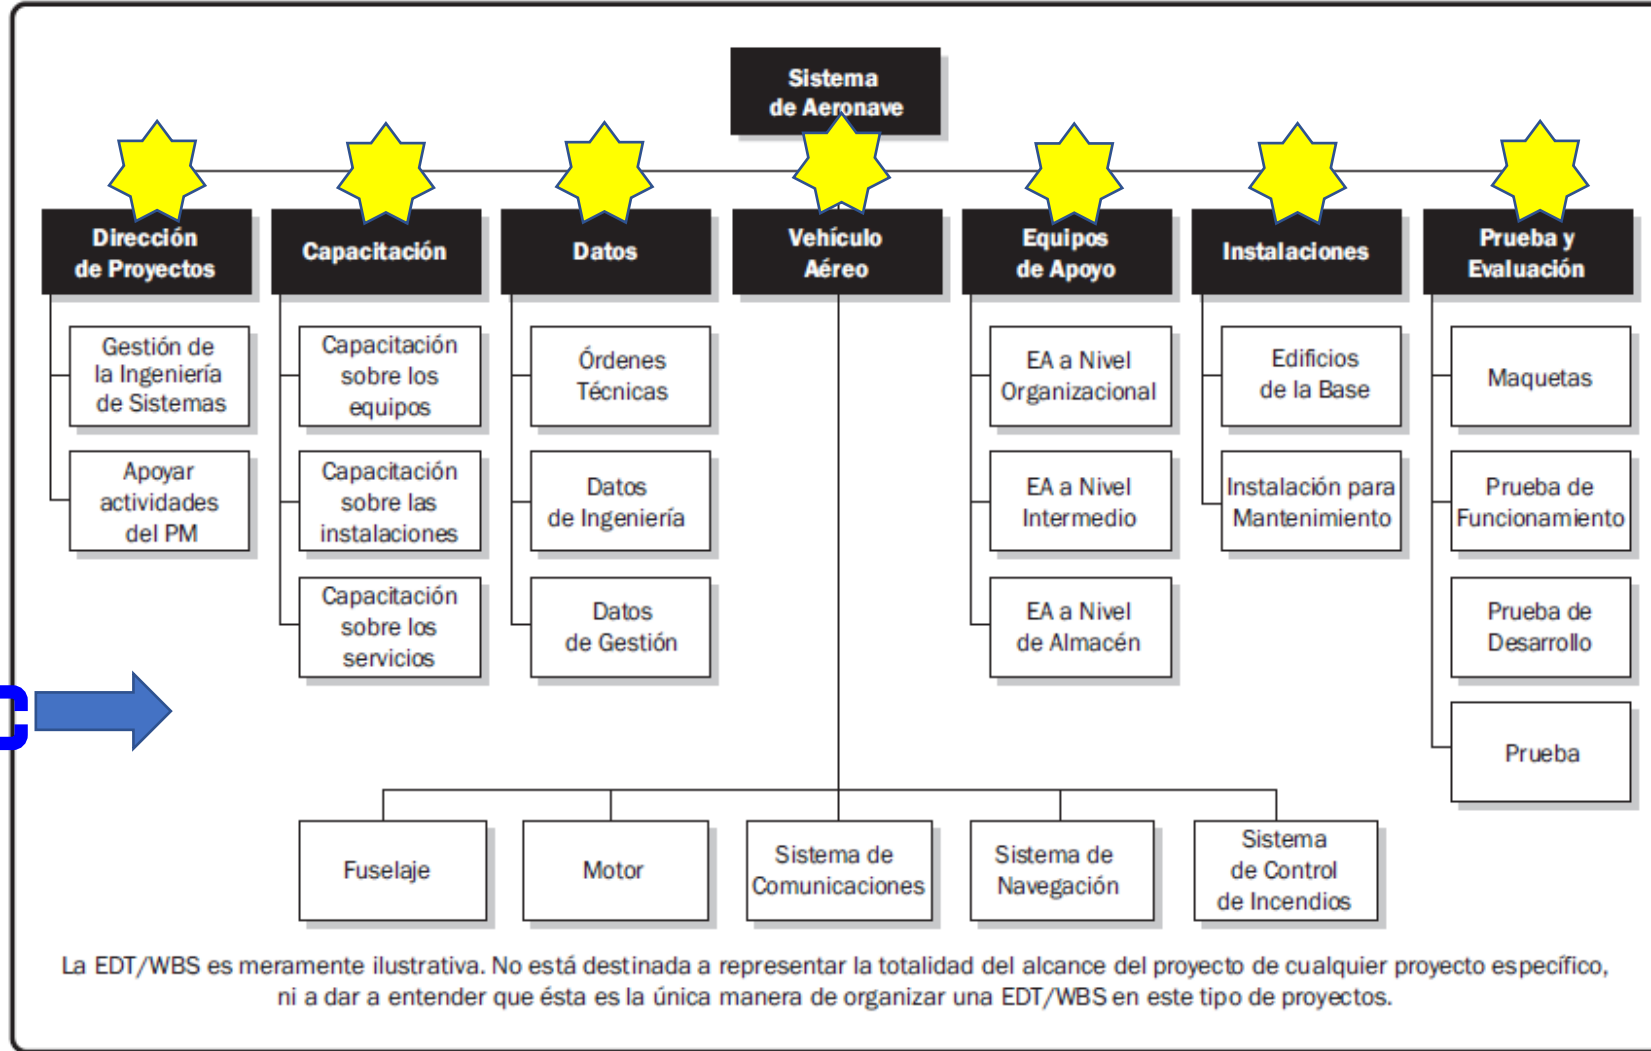


Gráfico 5-14. Ejemplo de una EDT/WBS basada en los Entregables Principales

Dirección de Proyectos en síntesis

• Organización y Preparación

☐ Alcance

☐ Tiempo – Estimaciones – Cronograma.

☐ Costo.

☐ CALIDAD

- Entorno Organizacional (ISO 9001)
- Producto (ISO 25000)
- Proceso y Proyecto (ISO/IEC 33000 / ISO/IEC 29110)
- Proceso (vs) Agilidad
