

Dirección de Proyectos en síntesis

• **GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO**

☐ **Conceptos de Riesgos:**

- **Modelo genérico**
- **Modelos especializados**

☐ **Plan de Gestión de Riesgos.**


☐ **Ciclos de Vida y Estrategias de Desarrollo enfocados en Riesgos.**

☐ **G. de Integración del Tiempo con la Gestión de Riesgos.**


☐ **Cronograma adaptado a Riesgos**

PMBOK – “Triángulo de Hierro de PM”

TRIPLE RESTRICCIÓN BÁSICA

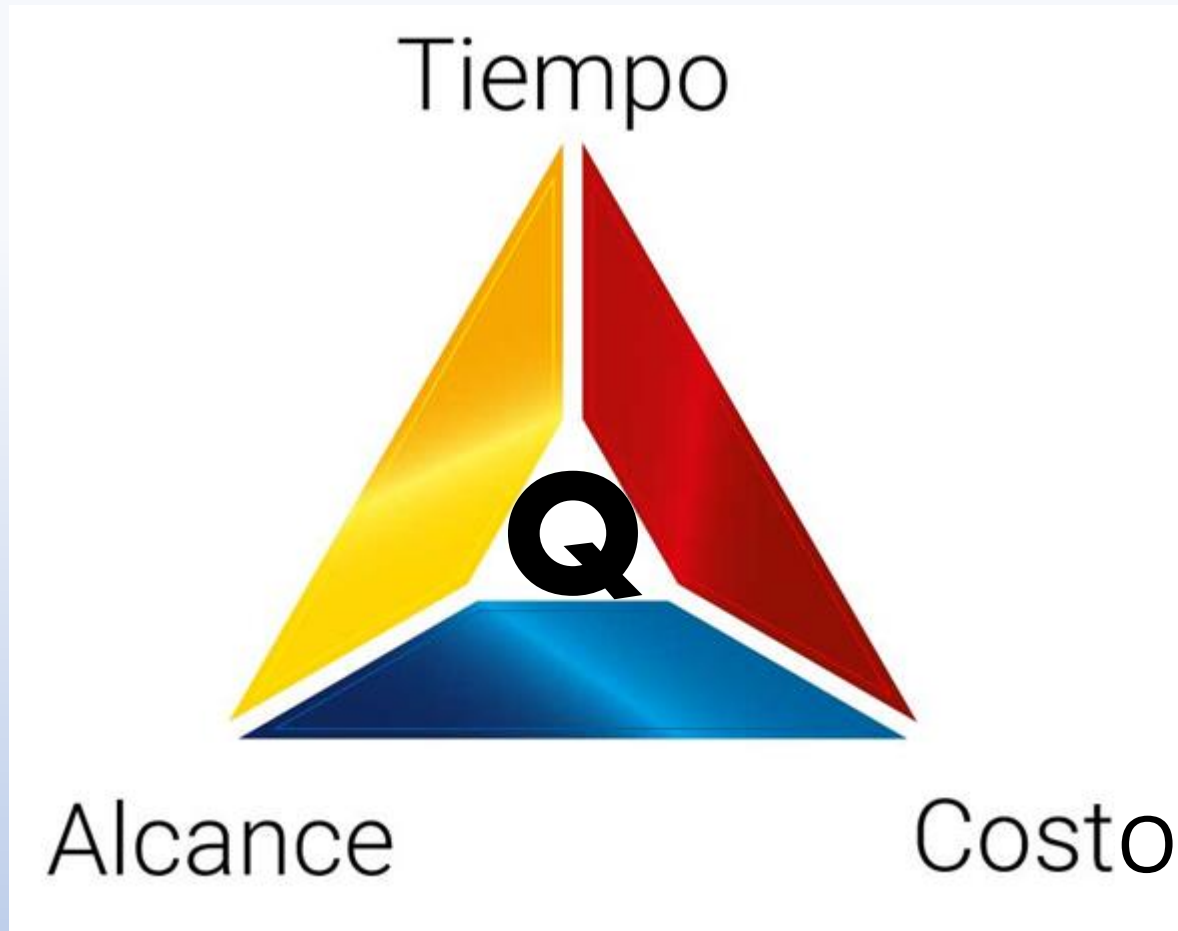

TRIPLE RESTRICCIÓN **AMPLIADA**

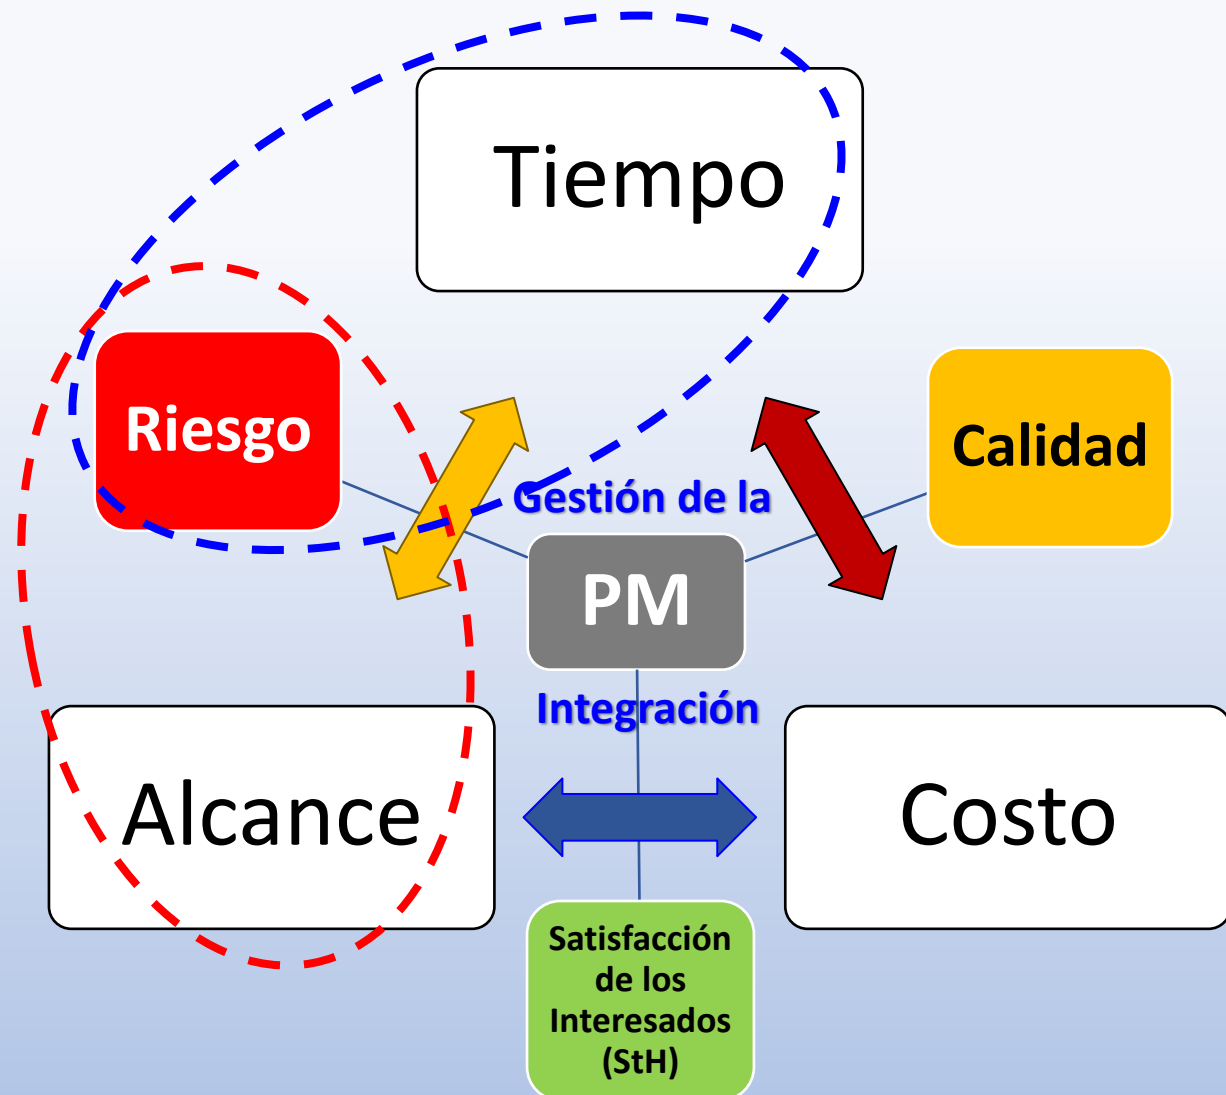

CONCEPTOS BÁSICOS DE RIESGOS

- **RIESGO**

- ☐ Real Academia de la Lengua Española

- Contingencia o proximidad de un daño.
- Posibilidad de sufrir daño o pérdida.

- ☐ Actividades: (PDCA)

- **Evaluación**: Identificar y Enfocarse.
- **Control**: Actuar, Controlar y Revisar.

- ☐ Fuentes de Riesgo

- Riesgos asociados al Cliente y/o Usuario.
- Riesgos asociados a los calendarios.
- Riesgos asociados a los recursos.
- Riesgos asociados a la Experiencia.
- Riesgos asociados al Proceso de Administración de Proyectos.

http://www.liderdeproyecto.com/articulos/conceptos_basicos_de_riesgos.htm
l#:~:text=La%20Real%20Academia%20de%20la,o%20proximidad%20de%20un%20da%C3%B1o.&text=La%20administraci%C3%B3n%20de%20riesgos%20son,lograr%20los%20objetivos%20del%20proyecto.

PMBOK – Gestión de los riesgos del proyecto

22/6/2020



Gráfico 11-1. Descripción General de la Gestión de los Riesgos del Proyecto

PMBOK – Gestión de los riesgos del proyecto

Los **riesgos** tienen el **potencial de** hacer que el proyecto se desvíe del plan y **no logre los objetivos** definidos para el mismo.

La **efectividad** de la Gestión de Riesgos **impacta** en el **éxito del Proyecto**.

- **Riesgo individual** (**evento o condición incierta** que, si se produce, tiene un **efecto positivo o negativo** en uno o mas de los objetivos del proyecto).
- **Riesgo general** (**efecto de la incertidumbre** sobre el proyecto en su conjunto)

Efectos sobre los objetivos del proyecto:

- **Positivo >> OPORTUNIDAD**
- **Negativo >> AMENAZA**

PMBOK – Gestión de los riesgos del proyecto

LOS RIESGOS SEGUIRÁN SURGIENDO DURANTE LA VIDA DEL PROYECTO

- Por lo tanto, los **procesos de Gestión de los Riesgos** del Proyecto deben llevarse a cabo **de manera iterativa**.

EL RIESGO INICIAL SE PLANIFICA

- Estrategia del Proyecto: **METODOLOGÍA DE DESARROLLO** o **CRONOGRAMA**.

EL RIESGO INICIAL SE MODIFICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- El riesgo también debe ser **controlado y gestionado** durante el CV.

NECESIDADES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

- **Riesgo aceptable. Umbral de riesgos. Niveles de impacto de riesgo.**


PMBOK – Tendencias y Prácticas Emergentes en la Gestión de los riesgos del proyecto

RIESGOS NO RELACIONADOS CON EVENTOS




RIESGO DE VARIABILIDAD.
RIESGO DE AMBIGÜEDAD.

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN DEL PROYECTO



HACER FRENTE A LOS RIESGOS EMERGENTES.

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RIESGOS

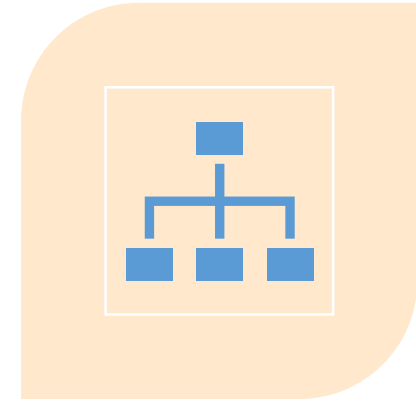

UN ENFOQUE COORDINADO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN TODA LA EMPRESA



PMBOK – Adaptación de la Gestión de los riesgos a cada tipo de proyecto



TAMAÑO



COMPLEJIDAD



IMPORTANCIA



**ENFOQUE DE
DESARROLLO**

Dirección de Proyectos en síntesis

• **GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO**

☐ **Conceptos de Riesgos**

- **Modelo genérico**
- **Modelos especializados**

☐ **Plan de Gestión de Riesgos.**

☐ **Ciclos de Vida y Estrategias de Desarrollo enfocados en Riesgos.**

☐ **G. de Integración del Tiempo con la Gestión de Riesgos.**

☐ **Cronograma adaptado a Riesgos.**

PMBOK – Plan de Gestión de los riesgos del proyecto

ESTRATEGIA DE RIESGOS

- Enfoque general para la GR del proyecto.

METODOLOGÍA

- Métodos y herramientas.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

- Matriz RACI / RASCI.

CATEGORÍAS DE RIESGOS

- Estructura de desglose de los riesgos (RBS).

Gráfico 11-4. **RBS**
Tabla 11-1. **Probabilidad e Impactos**
Gráfico 11-5. **Matriz de Probabilidad e Impacto con Esquema de Puntuación**


CALENDARIO

- Cuándo y con qué frecuencia se llevarán a cabo los procesos de Gestión de los Riesgos.

Dirección de Proyectos en síntesis

- **CICLOS DE VIDA Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ENFOCADOS EN RIESGOS.**


Spiral Model

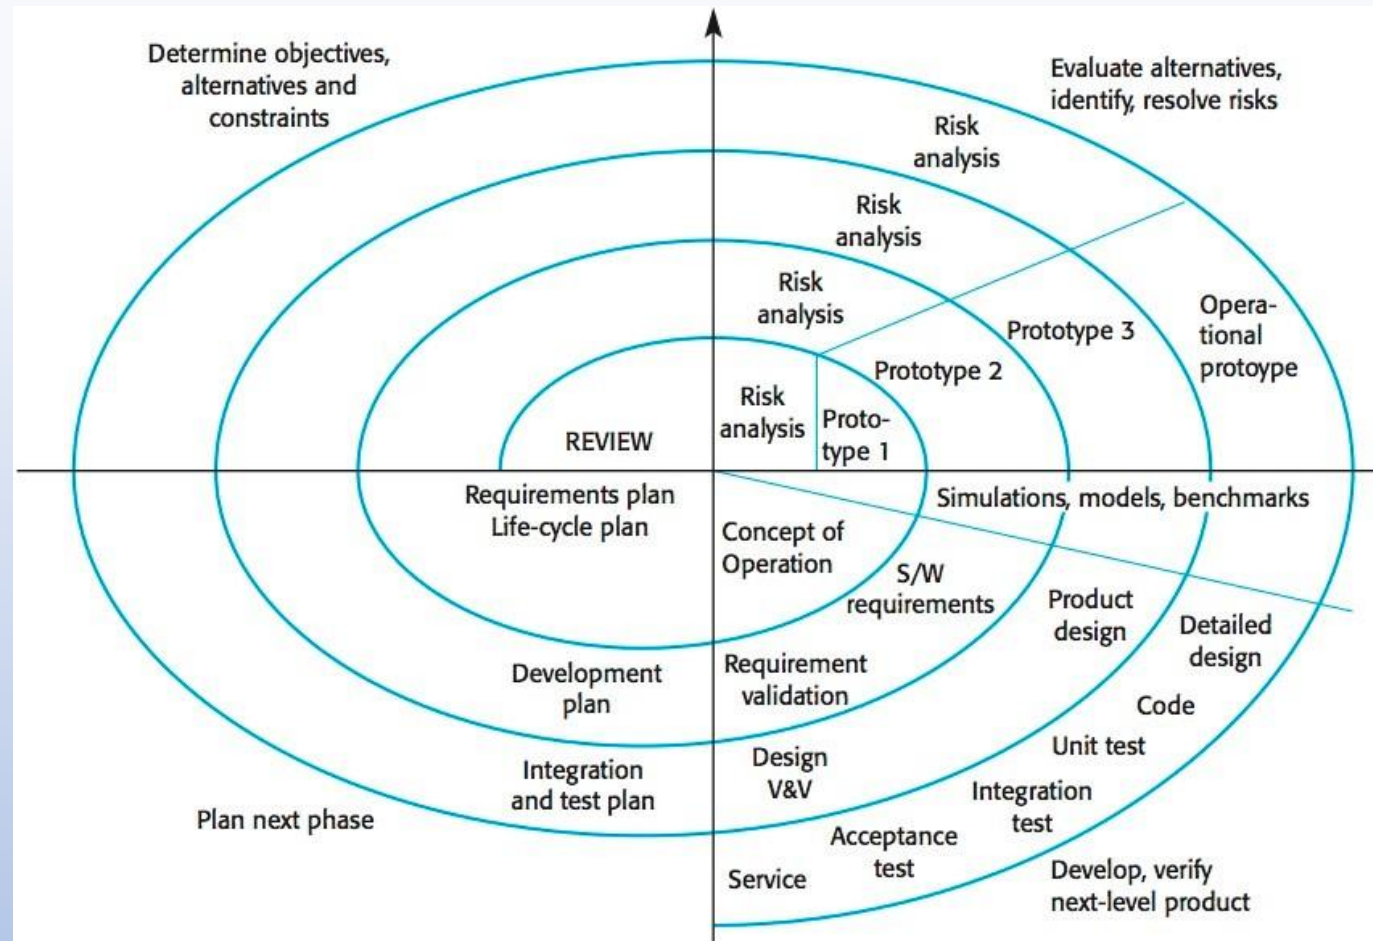

Dirección de Proyectos en síntesis

- **CICLOS DE VIDA Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ENFOCADOS EN RIESGOS.**

Win Win Spiral Model

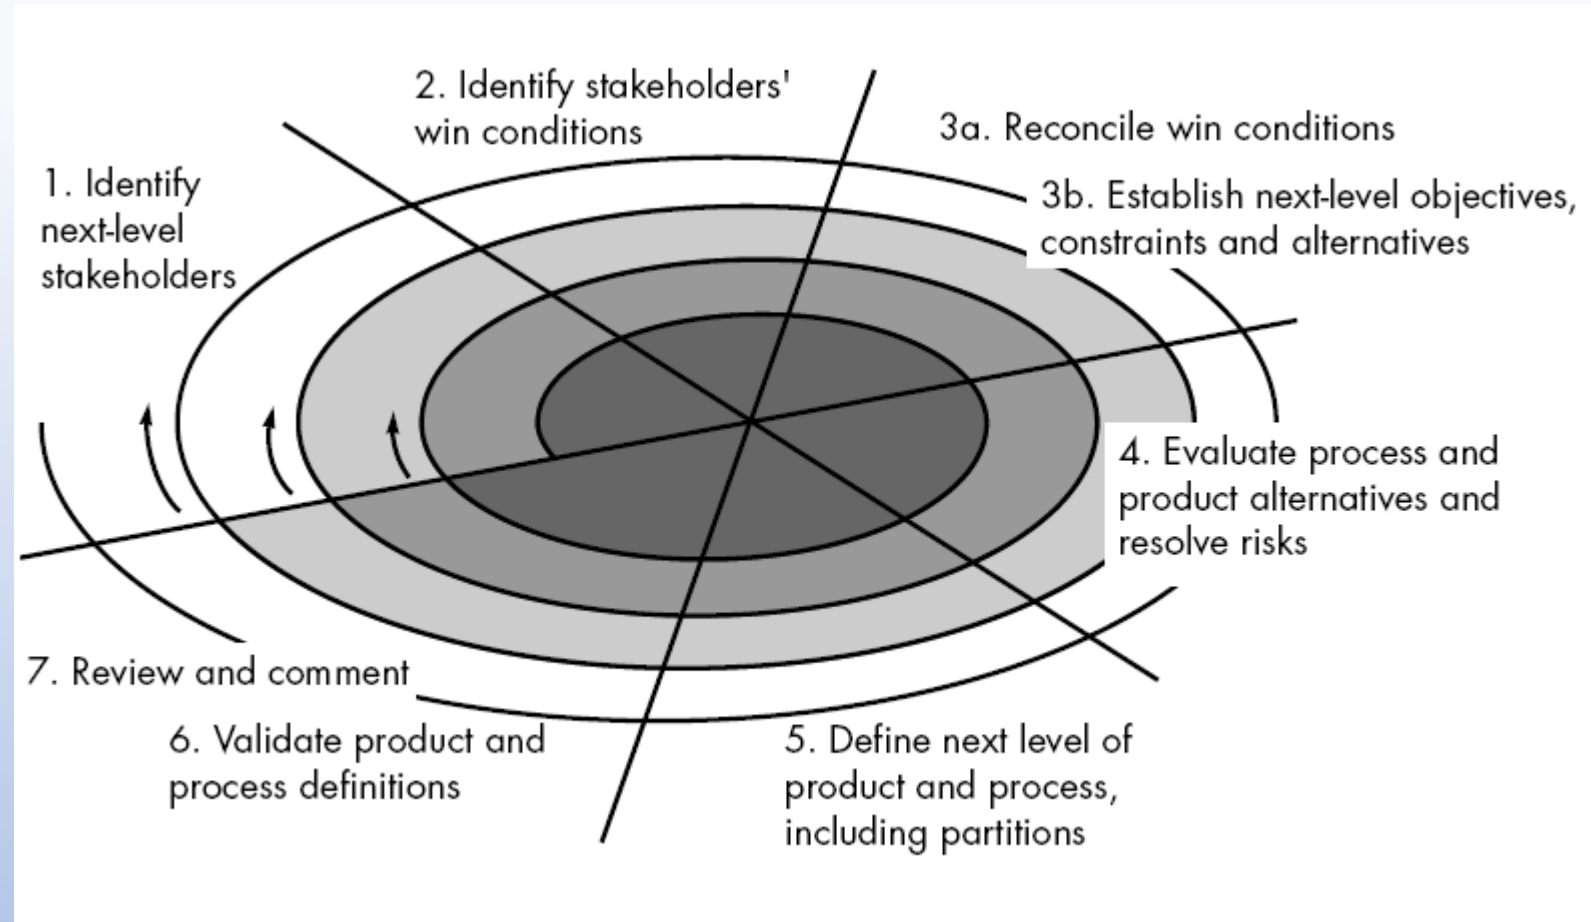

Dirección de Proyectos en síntesis

- **CICLOS DE VIDA Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ENFOCADOS EN RIESGOS.**

- ✓ **Gestión de riesgos clásica**

- <https://www.pmi.org/learning/library/practical-risk-management-approach-8248>

- ✓ **Gestión ágil de riesgos**

- <https://agileriskmanagement.org/agile-risk-management/#:~:text=Agile%20Risk%20Management%20refers%20to,techniques%20to%20manage%20project%20risks.>
- <https://www.agilealliance.org/wp-content/uploads/2016/01/Agile-Risk-Management-Agile-2012.pdf>
- <https://www.todaysoftmag.com/article/1367/a-simple-approach-for-risk-management-in-scrum>
- <https://www.isaca.org/resources/isaca-journal/issues/2016/volume-2/risk-management-in-agile-projects>

- ✓ **Risk IT Framework en la empresa**

- <http://ccisa.com.mx/InfoCCISA/Archivo/The%20Risk%20IT%20Framework.pdf>
- <http://www.ucipfg.com/Repositorio/MATI/MATI-01/Unidad4/lecturas/51855611-Risk-IT-Framework-Espanol.pdf>
- <https://www.pmi.org/learning/library/integrated-risk-management-framework-organizational-success-7980>

Dirección de Proyectos en síntesis

• **GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO**

☐ **Conceptos de Riesgos**

- **Modelo genérico**
- **Modelos especializados**

☐ **Plan de Gestión de Riesgos.**

☐ **Ciclos de Vida y Estrategias de Desarrollo enfocados en Riesgos.**

☐ **G. de Integración del Tiempo con la Gestión de Riesgos.**

☐ **Cronograma adaptado a Riesgos.**
