



FIE

FACULTAD DE INGENIERIA DEL EJERCITO
Universidad de la Defensa Nacional
90 años formando ingenieros para el desarrollo y la defensa nacional

CARRERA: *Ingeniería en Informática*

MATERIA: *Proyecto de Promoción y Síntesis*

<Proyecto> **Caso de negocio**

Declaración de confidencialidad

Este **<título del documento>** junto con todos los anexos a este se considerará Propietario/Información confidencial de **<company>**

Hay muchas maneras de documentar un caso de negocio. El criterio más importante es mantenerlo lo suficientemente corto y sucinto como para que la ajetreada audiencia de la dirección ejecutiva lo lea y digiere y para transmitir directamente la información de resultados con pruebas de apoyo sobresalientes y contundentes. Los volúmenes de explicación, filosofía, procedimientos y material adjunto no se leerán.

Este es un FRAMEWORK de instrucción básico de los tipos de información que debe incluir en su caso de negocio. Cada proyecto es diferente, y hacer un caso de negocio persuasivo requiere que usted dirija el proyecto en contexto. Agregue secciones y subsecciones o reagrupe el material según sea necesario para abordar los detalles de su proyecto y entorno organizativo, pero manténgalo enfocado en los resultados finales. Use el mismo formato de informe que el plan de negocios de su organización para que sea familiar para la administración ejecutiva.

Resumen Ejecutivo

El Resumen Ejecutivo describe breve y concisamente el proyecto, sus beneficios, el ROI y el calendario estimado para su finalización. Su propósito es expresar en términos adecuados para la consulta por ejecutivos ocupados lo que usted quiere hacer, cuánto costará, por qué es bueno y cuándo se puede entregar. El resto de este documento debe construirse en torno a la compatibilidad con todas las representaciones realizadas en el Resumen Ejecutivo.

A continuación se da un ejemplo de los contenidos de un resumen ejecutivo típico. Otra alternativa que, luego de su primera aprobación, puede ser ampliado con un resumen ejecutivo típico, es el uso de una presentación gráfica en base a una representación CANVAS (se describe en apartado **ANEXO** del presente documento).

Ejemplo:

Durante los próximos 3 años, el plan de negocios de XYZ, Inc. requiere aumentar las ventas de piezas de repuesto de 3 millones a 30 millones de dólares a través del mayor uso de las subastas por Internet (**Nota: se debe presentar con hechos conocidos y relevantes**). Este rápido aumento de las ventas requerirá mejoras significativas en las aplicaciones de Internet de la empresa y la infraestructura de apoyo (**Nota: proporcionar una breve descripción del problema o necesidad**). Con este fin se encargó a un grupo de trabajo que desarrollara un plan rentable que posicionara a la empresa para alcanzar sus objetivos de mejora de ingresos y mantuviera sus objetivos de margen del 23% (**Nota: indicar la solución**).

Este informe proporciona las conclusiones del grupo de trabajo y presenta una propuesta para un proyecto que apoya directamente los objetivos de negocio de la empresa.

El alcance del proyecto, los resultados y el ROI esperado se resumen a continuación:

Alcance del proyecto (4 meses de duración – Costo á \$1.7 millones)

- Adquirir o licenciar un sistema de cumplimiento electrónico que soporte la estructura de productos y los modelos de gestión de costes de la empresa
- Interconectar el sistema ERP de la empresa con el sistema de cumplimiento electrónico para que la información del producto y los pedidos resultantes se puedan compartir y mantener sin problemas

- Subcontratar la administración de granjas de servidores a un proveedor principal para garantizar la seguridad adecuada de las instalaciones, el tiempo de actividad y el ancho de banda
- Realizar simulaciones de subasta y cumplimiento
- Lanza una nueva campaña de marketing para impulsar el negocio de subastas

Resultados

- Capacidad para realizar hasta 25 subastas simultáneamente a nivel global, proporcionando a la empresa un aumento del 600% en la capacidad de penetración en el mercado
- Capacidad de enrutar pedidos para su cumplimiento dentro de los 12 minutos del cierre de la subasta; una mejora de 4 horas sobre la función de procesamiento de pedidos existente
- Capacidad para soportar volúmenes de pedidos 30 veces los niveles actuales (de \$3 millones a \$300 millones) con sólo un aumento del 20% en los niveles de personal (\$3.1 millones en los próximos 3 años)
- Capacidad para proporcionar a la fuerza de ventas acceso en tiempo real a los datos de productos y subastas de 24 por 7

Retorno de la inversión (ROI)

Se espera que el retorno de la inversión de este proyecto promedie un 27% anual, como se resume a continuación.

	Year 1	Year 2	Year 3	Total
Improved Margin Contribution	1,380,000	3,450,000	6,210,000	11,040,000
Project Cost	1,700,000			1,700,000
Annual Maintenance	170,000	225,000	225,000	620,000
Increased Staffing	300,000	1,200,000	1,600,000	3,100,000
Marketing Launch	215,000			215,000
Facilities Outsourcing	96,000	151,200	173,880	421,080
Total Costs	2,481,000	1,576,200	1,998,880	6,056,080
Net Improvement to Operating Profit	(1,101,000)	1,873,800	4,211,120	4,983,920
Return on Investment	-44%	119%	211%	82%
Average Annual Return				27%

La aprobación de este proyecto por parte de la Dirección en los próximos 30 días permitirá al grupo de trabajo completar el proyecto, asegurando que se alcancen los objetivos de crecimiento de ingresos de la empresa.

Alineación estratégica

- Describa brevemente cualquier información de antecedentes necesaria para persuadir a la gerencia a sancionar el proyecto.
- Vincular el proyecto a planes y objetivos estratégicos de negocio.
- Identifique las necesidades empresariales que satisface el proyecto.
- Detallar las formas en que el proyecto se alinea, complementa, solapa o impacta otros proyectos que son importantes para la organización, tanto desde perspectivas empresariales como técnicas.

Alcance

Resumir los límites del proyecto a nivel conceptual y global. Limite la descripción a unas pocas frases. Los detalles de Scope deben guardarse para el Plan de proyecto.

Ejemplo:

El alcance del proyecto de mejora del valor del cliente se limitará a ampliar la funcionalidad de los procesos actuales de cumplimiento de pedidos dentro de la empresa. Los procesos de procesamiento de pedidos existentes se mejorarán para admitir una función completa de subasta / cumplimiento electrónico basada en Internet. No se prevé que el sistema ERP existente requiera modificaciones más allá de la interfaz con el sistema de cumplimiento electrónico implementado. El proyecto tardará aproximadamente 4 meses en completarse.

Retorno de la inversión (ROI)

El RETORNO de la inversión se expresa como un cálculo del aumento de los beneficios obtenidos por un proyecto ponderado con respecto a los costos de conducción y apoyo al proyecto. El cálculo debe medir el ROI a corto y largo plazo; debe reflejar el ROI anual para cada año durante un período de <años> años del proyecto, así como el ROI acumulado para todo el período.

Incluya la hoja de trabajo de ROI que ha desarrollado para ilustrar el desglose de beneficios y costos.

Componente del proyecto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
Mejora de los beneficios operativos						
Aumento de los ingresos						
Tema 1						
Tema 2						
Tema 3						
Aumento total de los ingresos						

Componente del proyecto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
Reducciones (aumentos) en el costo operativo en curso						
Tema 1						
Tema 2						
Tema 3						
Reducciones totales de costes						
Mejora total del beneficio operativo						
Proyecto y costos continuos						
Costes de capital (depreciación de 5 años)						
Tema 1						
Tema 2						
Tema 3						
Capital total						
Costos de las instalaciones						
Tema 1						
Tema 2						
Tema 3						
Total de instalaciones						
Costos de servicios externos						
Tema 1						
Tema 2						
Tema 3						
Total de servicios externos						
Costos de trabajo y nómina						
Tema 1						
Tema 2						
Tema 3						

Componente del proyecto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
Total de Mano de Obra y Nómina						
Costos de mantenimiento y licencia						
Tema 1						
Tema 2						
Tema 3						
Mantenimiento total y licencias						
Costos de operación						
Tema 1						
Tema 2						
Tema 3						
Total de costos operativos						
Costos totales del proyecto						
Mejora del beneficio operativo neto						
Mejora de los beneficios operativos netos acumulados						
Retorno anual de la inversión						
Retorno acumulado de la inversión						

Suposiciones

Incluya una lista de supuestos sucintamente declarados que deben ser válidos para que el proyecto tenga éxito. Las suposiciones también pueden considerarse factores críticos de éxito. Cada suposición debe incluir una declaración de impacto, que describa lo que sucedería con el presupuesto del proyecto, el cronograma o las necesidades de personal si se viola la suposición.

Ejemplos:

- Autorizaciones oportunas de la dirección para proceder en hitos clave. El equipo necesitará autorizaciones para proceder dentro de las 48 horas posteriores a la solicitud. La autorización retrasada hará que el horario se deslice.
- Pago oportuno de proveedores de acuerdo con el cronograma de entregas contratadas. Los retrasos en los pagos podrían afectar al esfuerzo de gestión del proveedor y provocar retrasos en la programación de finalización del proyecto.
- Cambios mínimos en el alcance del proyecto y entregables. Cada cambio solicitado al alcance y los resultados acordados requerirá un análisis de impacto que, si es aprobado por la gerencia, podría dar lugar a cambios importantes en el presupuesto y el cronograma del proyecto para su finalización.

Ventajas

Enumerar los resultados que el proyecto producirá, declarados en términos cuantificables de valor y vinculados directamente a las partes interesadas, los objetivos del plan de negocio y los objetivos de estrategia de negocio que apoyan. Cada beneficio debe indicar una necesidad empresarial específica y la forma en que el proyecto abordará esa necesidad.

Ejemplo:

Objetivo del proyecto	Añade valor a			Soporta	
	Clientes	Propietarios	Empleados	Visión	Plan
Mejorar nuestro servicio al cliente y superar a la competencia mediante la reducción del tiempo que se tarda en procesar un pedido desde el mostrador de pedidos a través del envío de 5 días a 2 días	Niveles de servicio mejorados	Un mejor nivel de servicio mejora las ventas	Menor frustración y menos quejas de los clientes	Mejores niveles de ventas y servicio mejoran la posición de liderazgo de la industria	Apoya el objetivo de crecimiento del 20%
Aumente nuestras ventas en más de 40 millones de dólares al año al mantener las ventas perdidas debido a la escasez de existencias a	Niveles de servicio mejorados	Un mejor nivel de servicio mejora las ventas	Menor frustración y menos quejas de los clientes	El aumento de las ventas nos hace más atractivos para los inversores	Apoya el objetivo de crecimiento del 20% y mejora la posición de efectivo

Objetivo del proyecto	Añade valor a			Soporta	
	Clientes	Propietarios	Empleados	Visión	Plan
menos de 2 por día					
Mejorar nuestras colecciones identificando cuando un cliente tiene un cambio de 3 días en sus hábitos de pago	Evita situaciones embarazosas de deudas malas	Mejora el valor de la organización	Acerca a los empleados a la propiedad	Mejores niveles de ventas y servicio mejoran la posición de liderazgo de la industria	Apoya el objetivo de flujo de caja y reduce las deudas incobrables

Análisis de riesgos

Enumere los factores de riesgo conocidos que pueden afectar al proyecto. Especifique lo siguiente para cada riesgo:

- Categoría (por ejemplo, relacionada con la tecnología, los cambios organizativos, el mercado, etc.)
- Probabilidad de ocurrencia – H,M,L
- Impacto en el proyecto – H,M,L
- Grado de dificultad para detectar – H,M,L
- Estrategia de prevención
- Indicadores de detección
- Remediar acciones en caso de ocurrencia

Línea de tiempo estimada

Describa, con el gráfico de programación de apoyo, la duración estimada de todo el proyecto, desglosada por fases constituyentes. Incluya las fechas de inicio y finalización propuestas y los hitos clave.

Costos estimados

Detallar las estimaciones de costos para todo el ciclo de vida del proyecto, desglosados por fase del proyecto. Separe los costos en las categorías generales de Trabajo, Equipo, Servicios Externos, Instalaciones y Costos Operativos. Las partidas de costes específicas para cada fase (por ejemplo, equipo de proyecto, recursos de conocimiento sin equipo, equipo informático, capacitación, alquiler, suministros, pérdidas de productividad, etc.) deben encajar en una o más de estas categorías generales. Sume las posiciones de coste de cada categoría para estimar un total para la categoría.

Presentar los costos del proyecto en el formato utilizado para presentar presupuestos, que se puede encontrar en el plan de negocio de la organización. Utilice gráficos conocidos de clasificaciones de cuentas.

Ejemplo:

TOTALS (coste extendido x unidades)

	Unidad de Meas.	Costo	Unidades	Trabajo	Equipo.	Servicios externos	Instalaciones	Costos de operación	Total (fila de suma)	Total de fase
Planificación (intervalo de fechas o número de meses)										
Equipo del proyecto	Horas	\$/hora	N.o de horas						0	
Recursos de conocimiento no en equipo	Horas	\$/hora	N.o de horas						0	
Equipo de cómputo (lista de elementos específicos)	Ella.								0	
Entrenamiento	Ella.								0	
Subcontratistas / Consultores	Días	\$/día	N.o de días						0	
Suministros y Gastos	Ella.								0	
Alquiler	Meses	\$/mes.	N.o de meses						0	
Pérdidas de productividad y otros Opportunitycostos	Horas	\$/hora	N.o de horas						0	0
Requisitos (intervalo de fechas o número de meses)										
Equipo del proyecto	Horas	\$/hora	N.o de horas						0	
Recursos de conocimiento no en equipo	Horas	\$/hora	N.o de horas						0	
Equipo de cómputo (lista de elementos específicos)	Ella.								0	

TOTALS (coste extendido x unidades)										
	Unidad de Meas.	Costo	Unidades	Trabajo	Equipo.	Servicios externos	Instalaciones	Costos de operación	Total (fila de suma)	Total de fase
Entrenamiento	Ella.								0	
Subcontratistas / Consultores	Días	\$/día	N.o de días						0	
Suministros y Gastos	Ella.								0	
Alquiler	Meses	\$/mes.	N.o de meses						0	
Pérdidas de productividad y otros Opportunitycostos	Horas	\$/hora	N.o de horas						0	0
Diseño (intervalo de fechas o número de meses)										
Equipo del proyecto	Horas	\$/hora	N.o de horas						0	
Recursos de conocimiento no en equipo	Horas	\$/hora	N.o de horas						0	
Equipo de cómputo (lista de elementos específicos)	Ella.								0	
Entrenamiento	Ella.								0	
Subcontratistas / Consultores	Días	\$/día	N.o de días						0	
Suministros y Gastos	Ella.								0	
Alquiler	Meses	\$/mes.	N.o de meses						0	
Pérdidas de productividad y otros Opportunitycostos	Horas	\$/hora	N.o de horas						0	0
Construcción (Intervalo de fechas o número de meses)										

TOTALS (coste extendido x unidades)

	Unidad de Meas.	Costo	Unidades	Trabajo	Equipo.	Servicios externos	Instalaciones	Costos de operación	Total (fila de suma)	Total de fase
Equipo del proyecto	Horas	\$/hora	N.o de horas						0	
Recursos de conocimiento no en equipo	Horas	\$/hora	N.o de horas						0	
Equipo de cómputo (lista de elementos específicos)	Ella.								0	
Entrenamiento	Ella.								0	
Subcontratistas / Consultores	Días	\$/día	N.o de días						0	
Suministros y Gastos	Ella.								0	
Alquiler	Meses	\$/mes.	N.o de meses						0	
Pérdidas de productividad y otros Opportunitycostos	Horas	\$/hora	N.o de horas						0	0
Despliegue (intervalo de fechas o número de meses)										
Equipo del proyecto	Horas	\$/hora	N.o de horas						0	
Recursos de conocimiento no en equipo	Horas	\$/hora	N.o de horas						0	
Equipo de cómputo (lista de elementos específicos)	Ella.								0	
Entrenamiento	Ella.								0	

TOTALS (coste extendido x unidades)										
	Unidad de Meas.	Costo	Unidades	Trabajo	Equipo.	Servicios externos	Instalaciones	Costos de operación	Total (fila de suma)	Total de fase
Subcontratistas / Consultores	Días	\$/día	N.o de días						0	
Suministros y Gastos	Ella.								0	
Alquiler	Meses	\$/mes.	N.o de meses						0	
Pérdidas de productividad y otros Opportunitycostos	Horas	\$/hora	N.o de horas						0	0
Post Implementation Review (Intervalo de fechas o número de meses)										
Equipo del proyecto	Horas	\$/hora	N.o de horas						0	
Recursos de conocimiento no en equipo	Horas	\$/hora	N.o de horas						0	
Equipo de cómputo (lista de elementos específicos)	Ella.								0	
Entrenamiento	Ella.								0	
Subcontratistas / Consultores	Días	\$/día	N.o de días						0	
Suministros y Gastos	Ella.								0	
Alquiler	Meses	\$/mes.	N.o de meses						0	
Pérdidas de productividad y otros Opportunitycostos	Horas	\$/hora	N.o de horas						0	0
Total				0	0	0	0	0	0	0

ANEXO: Resumen Ejecutivo (CANVAS)

- Enfoque 1: LIENZO MODELO DE NEGOCIO (BMC)




Socios clave  ¿quiénes son nuestros socios clave? ¿quiénes son nuestros proveedores clave? ¿qué recursos clave vamos a adquirir de nuestros socios? ¿qué actividades clave realizan los socios? <i>motivaciones para socios optimización y economía reducción de riesgo e incertidumbre adquisición de recursos y actividades particulares</i>	Actividades clave  ¿qué actividades clave requiere nuestra propuesta de valor? ¿nuestros canales de distribución? ¿nuestras relaciones con clientes? ¿nuestras fuentes de ingresos? <i>categorías producción resolución de problemas plataforma/red</i>	Propuesta de Valor  ¿qué valor entregamos al cliente? ¿cuál de los problemas de nuestro cliente vamos a ayudar a resolver? ¿qué paquete de productos o servicios ofrecemos a cada segmento de cliente? ¿qué necesidades del cliente estamos satisfaciendo? <i>características novedad rendimiento personalización "hacer el trabajo" diseño marca/estatus precio reducción de coste reducción de riesgo accesibilidad conveniencia usabilidad</i>	Relaciones con clientes  ¿qué tipo de relación espera que establezcamos y mantengamos cada uno de nuestros segmentos de cliente? ¿cuáles hemos establecido? ¿cómo están integrados con nuestro modelo de negocio? ¿cuánto cuestan? <i>ejemplos asistencia personal, asistencia personal dedicada, autoservicio, servicios automatizados, comunidades y co-creación</i>	Segmentos de cliente  ¿para quién estamos creando valor? ¿quiénes son nuestros clientes más importantes? <i>mercado de masas mercado de nicho segmentado diversificado plataforma multilateral</i>
Estructura de costes  ¿cuáles son los costes más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio? ¿qué recursos clave son los más caros? ¿qué actividades clave son las más caras? tu negocio está basado en: coste (estructura de coste más escueta, propuesta de valor de precio bajo, max automatización, outsourcing extensivo...) valor (centrado en creación de valor, propuesta de valor premium...) características de ejemplo: costes fijos (salarios, rentas, estructuras...) bajo, max automatización, o costes variables, economía de escala, economía de alcance...		Fuentes de ingresos  ¿para qué valor están realmente dispuestos a pagar nuestros clientes? ¿por qué pagan actualmente? ¿cómo están pagando ahora? ¿cómo preferirían pagar? ¿cuánto contribuye cada fuente de ingresos a los ingresos totales? <i>tipos: venta de activos, pago por uso, cuota de suscripción, préstamo/alquiler/leasing, fiancias, tasas intermediación, publicidad precio fijo: listas de precios, dependiente de la funcionalidad del producto, dependiente del segmento del cliente, dependiente del volumen precio dinámico: negociación, gestión de rendimientos, mercado en tiempo real.</i>		

Lienzo descargado desde la web de:
www.innokabi.com


Traducción del original de www.businessmodelgeneration.com

Una posible secuencia de planificación:

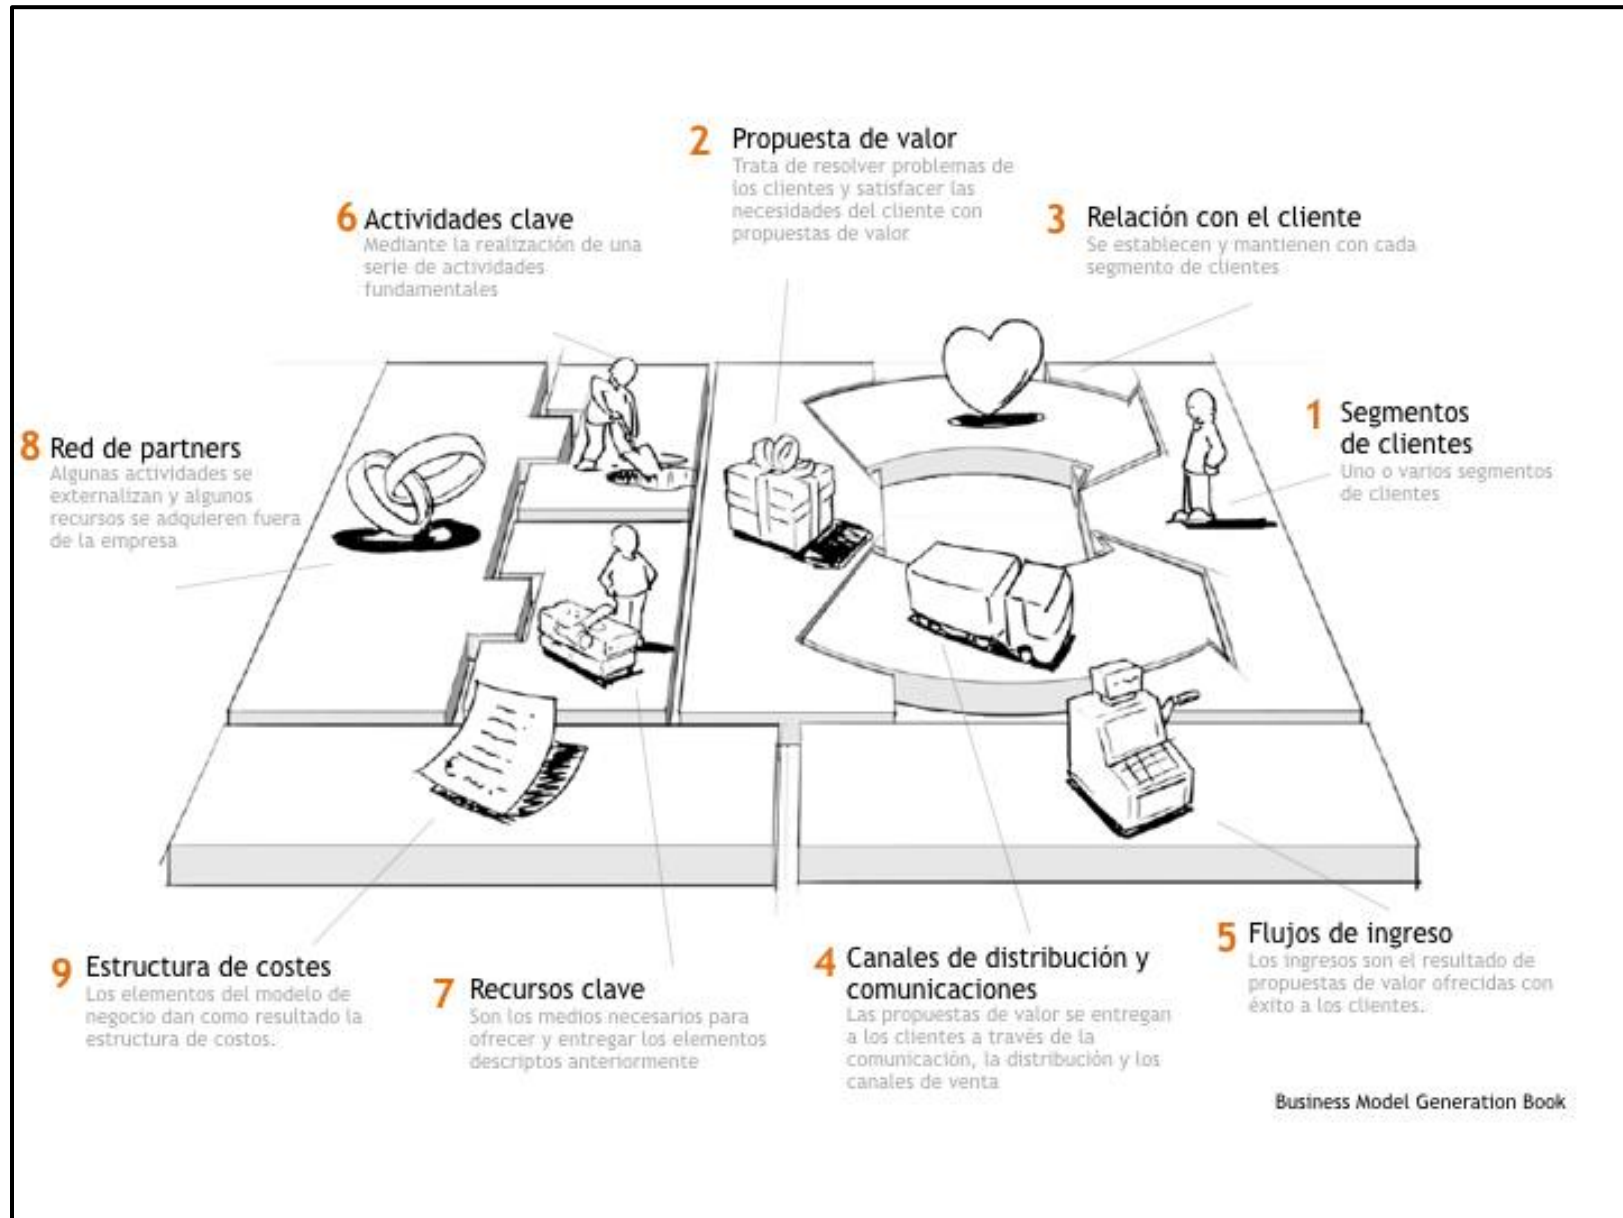

- Enfoque 2: LEAN CANVAS

Los 9 bloques del lienzo Lean

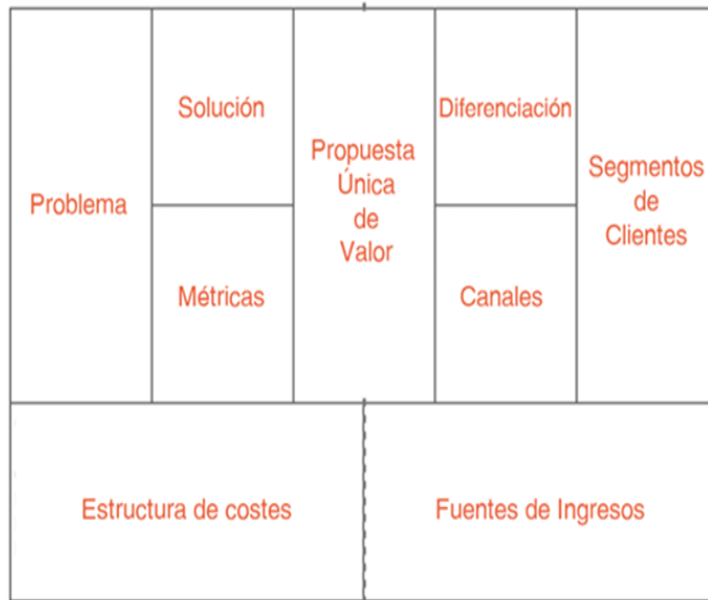

1. **Propuesta única de valor:** que ofrecemos a nuestros clientes, siempre enfocados a beneficios y no funcionalidades.
2. **Segmentos de clientes:** a quién nos dirigimos.
3. **Estructura de costes:** en qué tenemos que gastar para desarrollar y ofrecer nuestra propuesta de valor.
4. **Fuentes de ingresos:** cómo vamos a monetizar nuestro proyecto. Junto con la estructura de costes forman la rentabilidad del modelo de negocio.

5. **Problema:** qué problema hemos detectado que es suficientemente doloroso para un buen número de personas. Podemos listar los 3 subproblemas más importantes que hayamos detectado sobre una problemática concreta.
6. **Solución:** qué solución proponemos para paliar el problema. Podemos listar las 3 características principales de la solución.
7. **Métricas:** en qué números nos tenemos que fijar para saber el estado de nuestro negocio.
8. **Diferenciación (o ventaja competitiva):** qué nos diferencia realmente de la competencia de forma que no sea fácil imitar.
9. **Canales:** a través de qué medios proporcionamos nuestra propuesta de valor a nuestros clientes.

Novedades que aporta Lean CANVAS

- En el Lean Canvas los bloques de problema y solución suponen una reformulación de la idea de negocio, de forma que nos obliguemos a reflexionar sobre los posibles clientes.
- El bloque de la diferenciación o ventaja competitiva puede ser el más difícil de definir, ya que encontrar una diferencia que sea difícil de copiar es realmente complejo. Lo más importante es encontrar la clave que nos diferencie del resto de propuestas del mercado.

- Las métricas son toda una novedad al hablar de modelos de negocio. Identificar los números a los que tenemos que prestar atención es muy importante para maximizar nuestras opciones de éxito.
- No tenemos que dejarnos seducir por las métricas vanidosas como el número de visitas, sino trabajar con otras fundamentales como el embudo de conversión.
- Para trabajar con Lean Canvas debemos tener en cuenta que es una herramienta flexible y no debemos obsesionarnos en hacer un modelo perfecto. Debemos trabajar de forma iterativa completando y ajustando cada bloque a medida que pongamos a prueba nuestras hipótesis.
- Al principio la incertidumbre es máxima y necesitaremos realizar un ejercicio creativo para diseñar nuestro primer boceto de modelo de negocio con Lean Canvas. Y poco a poco iremos trabajando con cada hipótesis hasta dar con el modelo adecuado.
- Y por si tenías alguna duda, te confirmo que este lienzo es totalmente compatible con las metodologías lean.
- Otra de las diferencias está en los 2 bloques destinados a la parte de CONTACTO CON EL CLIENTE, CANALES Y RELACIÓN, mientras que el **Lean Canvas** dedica un solo bloque, el de CANALES. Ambos bloques se pueden fusionar sin mayores problemas.

Lean Canvas vs Business Model Canvas

- Los 2 lienzos son totalmente válidos a la hora de diseñar modelos de negocio.
- El lienzo original, **Business Model Canvas**, destaca las áreas como SOCIOS CLAVE, RECURSOS CLAVE y ACTIVIDADES CLAVE. Se recomienda en los que estas áreas sean muy importantes para el negocio. Por ejemplo, casos con una fuerte dependencia de socios externos, como podrían ser acuerdos de distribución; con una fuerte inversión inicial en maquinaria, locales, vehículos...; o con unos procesos muy estudiados que necesiten homologación.

Estructura del equipo del proyecto

Describir los roles del equipo del proyecto y admitir roles de expertos que no sean de equipo. Estructura de relaciones mediante una estructura de organigrama, si es posible. Detallar roles de la siguiente manera:

Lista de equipos candidatos

Enumere a las personas candidatas que constituirán el equipo básico del proyecto a tiempo completo (100% de tiempo dedicado al proyecto). Detallar cada rol, las habilidades necesarias para el rol, el nombre y la posición de la persona objetivo para desempeñar el rol (con candidatos calificados alternativos si es posible) y un resumen de las cualificaciones clave de esa persona que son relevantes para el rol.

Apoyo a los recursos de conocimiento

Enumere a las personas que no serán miembros del equipo principal del proyecto pero cuya experiencia especializada será necesaria para el proyecto de vez en cuando. Detallar cada rol no relacionado con el equipo, su relación con el proyecto, el nombre y la posición de la persona objetivo para desempeñar el rol (con candidatos calificados alternativos si es posible), la especificación de la experiencia clave de esa persona relevante para el proyecto, y una estimación de el tiempo que el individuo tendría que asignar al proyecto.

Recomendaciones

Recomendar el proyecto como la solución al problema de negocio y resumir las razones por las que es el mejor enfoque. También puede incluir cualquiera de las siguientes secciones, según corresponda:

- Consideraciones de financiación (cómo se puede financiar el proyecto)
- Cambios organizativos
 - que se verán afectados por el proyecto
 - cambios en los
 - procedimientos que afectan a los informes organizativos o la estructura
 - resistencia al cambio
 - por qué la aceptación del cambio es fundamental para el éxito del proyecto
- Medidas de rendimiento
- Problemas de implementación
- Próximos pasos

Apéndices

Adjunte datos de apoyo, informes de investigación, documentos asociados y otros materiales de apoyo según sea necesario.

Fuentes de consulta:

1. <https://www.projectmanagement.com/>
2. <https://innokabi.com/canvas-de-modelo-de-negocio/>
3. <https://www.emprenderalia.com>
4. <https://advenio.es/>
